

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABIBA

VALOR CONTRATADO R\$:

912.926,02

OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARABIBA

VALOR MEDIDO ATUAL R\$:

108.974,95

LOCAL: COREMÁS - PB

BDI:

22,77%

VALOR MEDIDO ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO:

597.232,07

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES			VALORES R\$		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS R\$	
			QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	MEDIDA OR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	PREÇO TOTAL MEDIDO NO PERÍODO R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				14.740,01	18.051,88				
1.1	PRO-46870444	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,0M X 2,0M)	1,00	153,05	187,44	153,05	187,44		1,00	100,00%	R\$ 18.051,88
1.2	913584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	12,43	784,84	961,19	9.755,56	11.947,59		12,43	100,00%	R\$ 11.947,59
1.3	90659	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS MONTADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	101,16	47,76	58,49	4.831,40	5.916,85		101,16	100,00%	R\$ 5.916,85
2		MOVIMENTO DE TERRA				10.582,87	12.961,54				
2.1	91382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	136,71	22,20	27,19	3.034,96	3.717,14		136,71	100,00%	R\$ 3.717,14
2.2	91358	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	72,61	59,58	72,97	4.326,10	5.298,35		72,61	100,00%	R\$ 5.298,35
2.3	91382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	54,55	22,20	27,19	1.211,01	1.483,21		54,55	100,00%	R\$ 1.483,21
2.4	90995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	55,67	36,12	44,24	2.010,80	2.462,84		55,67	100,00%	R\$ 2.462,84
3		SAPATA				31.022,90	37.991,85				
3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS AF_08/2017	1,46	551,70	675,67	805,48	986,48		1,46	100,00%	R\$ 986,48
3.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	96,48	160,48	196,54	15.483,11	18.962,18		96,48	100,00%	R\$ 18.962,18
3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	10,06	451,82	553,34	4.545,31	5.566,60		10,06	100,00%	R\$ 5.566,60
3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	10,06	205,96	252,24	2.071,96	2.537,53		10,06	100,00%	R\$ 2.537,53
3.5	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	241,00	15,37	18,82	3.704,17	4.535,62		241,00	100,00%	R\$ 4.535,62
3.6	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	235,20	13,10	16,04	3.081,12	3.772,61		235,20	100,00%	R\$ 3.772,61
3.7	96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	18,10	11,14	13,64	201,63	246,88		18,10	100,00%	R\$ 246,88
3.8	96548	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	7,60	10,62	13,01	80,71	98,88		7,60	100,00%	R\$ 98,88
3.9	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	65,10	16,12	19,74	1.049,41	1.285,07		65,10	100,00%	R\$ 1.285,07
4		VIGA BALDRAME				34.492,45	42.240,62				
4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BARRIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_02/2016	2,20	16,00	19,60	35,20	43,12		2,20	100,00%	R\$ 43,12
4.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	220,31	74,24	90,32	16.355,81	20.030,59		220,31	100,00%	R\$ 20.030,59
4.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	13,22	451,82	553,34	5.573,06	7.315,15		13,22	100,00%	R\$ 7.315,15
4.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	13,22	205,96	252,24	2.772,79	3.334,61		13,22	100,00%	R\$ 3.334,61
4.5	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	389,60	15,37	18,82	5.986,15	7.332,27		389,60	100,00%	R\$ 7.332,27
4.6	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	211,00	16,12	19,74	3.411,44	4.184,88		211,00	100,00%	R\$ 4.184,88
5		PILARES				25.583,47	31.334,09				
5.1	99445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	199,64	41,17	50,42	8.219,18	10.065,85		199,64	100,00%	R\$ 10.065,85
5.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	10,08	451,82	553,34	4.554,35	5.577,67		10,08	100,00%	R\$ 5.577,67
5.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	10,08	205,96	252,24	2.076,08	2.542,58		10,08	100,00%	R\$ 2.542,58
5.4	99762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	580,50	11,83	14,49	6.667,32	8.411,45		580,50	100,00%	R\$ 8.411,45

Marquesa Mendes da Silva
Engenheira Civil
CREA-PB 167779-5

5.5	92763	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	59,10	10,09	12,36	596,32	730,48			59,10	100,00%	R\$	-	R\$	730,48
5.6	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	22,70	9,86	12,08	223,82	274,22			22,70	100,00%	R\$	-	R\$	274,22
5.7	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	224,00	13,60	16,66	3.046,40	3.731,84			224,00	100,00%	R\$	-	R\$	3.731,84
6	VIGAS					47.244,62	57.860,77								
6.1	92265	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2022	264,23	96,01	117,58	25.368,72	31.068,16			264,23	100,00%	R\$	-	R\$	31.068,16
6.2	94971	CONCRETO FCC = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	16,49	451,82	553,34	7.450,51	9.124,58			16,49	100,00%	R\$	-	R\$	9.124,58
6.3	109670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	16,49	205,96	252,24	3.396,28	4.159,44			16,49	100,00%	R\$	-	R\$	4.159,44
6.4	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	285,30	13,41	16,42	3.825,87	4.684,63			285,30	100,00%	R\$	-	R\$	4.684,63
6.5	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	174,40	13,02	15,95	2.270,69	2.781,68			174,40	100,00%	R\$	-	R\$	2.781,68
6.6	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	64,90	11,83	14,49	767,77	940,40			64,90	100,00%	R\$	-	R\$	940,40
6.7	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	18,70	10,09	12,36	188,68	231,13			18,70	100,00%	R\$	-	R\$	231,13
6.8	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	17,60	9,86	12,08	173,54	212,61			17,60	100,00%	R\$	-	R\$	212,61
6.9	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	279,60	13,60	16,66	3.802,56	4.658,14			279,60	100,00%	R\$	-	R\$	4.658,14
7	VÉRIGAS					5.286,04	6.412,46								
7.1	93182	VÉRIGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	55,16	42,21	51,69	2.328,30	2.851,22			55,16	100,00%	R\$	-	R\$	2.851,22
7.2	93184	VÉRIGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	20,16	31,04	38,01	625,77	766,28			20,16	100,00%	R\$	-	R\$	766,28
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	55,16	41,37	50,67	2.281,97	2.794,96			55,16	100,00%	R\$	-	R\$	2.794,96
8	LAJE PRÉ-MOLDADA					88.756,13	108.703,47								
8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPLOADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF 11/2020	395,11	149,19	182,71	58.946,46	72.190,55			385,90	97,67%	R\$	-	R\$	70.508,13
8.2	92665	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2022	54,10	96,01	117,58	5.194,14	6.361,08			54,10	100,00%	R\$	-	R\$	6.361,08
8.3	91971	CONCRETO FCC = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	11,19	451,82	553,34	5.055,87	6.191,87			11,19	100,00%	R\$	-	R\$	6.191,87
8.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	11,19	205,96	252,24	2.304,69	2.822,57			11,19	100,00%	R\$	-	R\$	2.822,57
8.5	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	486,60	13,02	15,95	6.335,53	7.761,27			200,00	41,10%	R\$	-	R\$	3.190,00
8.6	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	104,50	11,83	14,49	1.236,24	1.514,21			0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
8.7	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	712,00	13,60	16,66	9.683,20	11.861,92			0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
9	ELEMENTOS VAZADOS					5.794,92	7.097,13								
9.1	101161	ALVENARIA DE VEDÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 75X50X5CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	31,87	181,83	222,69	5.794,92	7.097,13			31,87	100,00%	R\$	-	R\$	7.097,13
10	ALVENARIA DE VEDÇÃO					67.716,74	82.930,57								
10.1	103329	ALVENARIA DE VEDÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	656,20	68,55	83,95	44.982,51	55.087,99			656,20	100,00%	R\$	-	R\$	55.087,99
10.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC110E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	21,03	561,25	687,36	11.803,09	14.455,18			13,32	63,31%	R\$	-	R\$	9.152,20
10.3	560	MURO DE CONTOINHO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, CONTEUDO: ESCAVAÇÃO ALV. PEDRA, EMBAIXAMENTO, RADIER, CINTA, CHAMISCAO, REBOCCO H=2,50M	21,76	502,35	615,23	10.931,14	13.387,40			21,76	100,00%	R\$	-	R\$	13.387,40
11	PORTAS DE MADEIRAS					23.101,56	28.292,49								
11.1	90790	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X220CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	8,00	864,70	1.059,00	6.917,60	8.472,00			0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-

Marquesa Marques de Sousa Guedes
 Eng.ª Civil
 CREA-PB 167.79445-5

11.2	90788	BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	9,00	837,44	1.025,61	7.536,96	9.230,49	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.3	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,00	864,70	1.059,00	8.647,00	10.590,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12	PORTÕES DE FERRO												
12.1	90805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	740,64	907,06	1.481,28	1.814,12	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13	JANELAS DE FERRO												
13.1	90559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,46	757,34	927,51	1.863,06	2.281,67	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.2	90559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,12	757,34	927,51	848,22	1.038,81	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.3	90559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,05	757,34	927,51	6.096,59	7.466,46	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.4	90562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,34	749,27	917,63	1.004,02	1.229,62	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.5	90562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	21,48	749,27	917,63	16.094,32	19.710,69	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.6	90570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	7,16	769,05	941,86	5.506,40	6.743,72	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
14	COBERTURA												
14.1	90446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	390,67	39,48	48,35	15.423,65	18.888,89	390,67	100,00%	R\$	-	R\$	18.398,89
14.2	90219	CUMEIRA E ESGUÇO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	102,05	23,60	28,90	2.408,38	2.949,25	102,05	100,00%	R\$	-	R\$	2.749,25
14.3	90227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,04	58,79	72,00	237,51	290,88	4,04	100,00%	R\$	-	R\$	290,88
15	IMPERMEABILIZAÇÃO												
15.1	90546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LUNA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICA, E=3MM. AF_06/2018	92,29	100,02	122,49	9.230,85	11.304,60	92,29	100,00%	R\$	-	R\$	11.304,60
15.2	90557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS. AF_06/2018	630,29	45,68	55,94	28.791,65	35.258,42	0,00	0,00%	R\$	48.010,23	R\$	98.031,14
16	REVESTIMENTOS DE PAREDES												
16.1	80879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	757,22	3,38	4,14	2.559,40	3.134,89	757,22	100,00%	R\$	-	R\$	3.134,89
16.2	80894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	378,61	5,07	6,21	1.919,55	2.351,17	378,61	100,00%	R\$	-	R\$	2.351,17
16.3	80878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	394,00	3,73	4,57	1.469,62	1.800,58	394,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.800,58
16.4	80835	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	470,96	25,45	31,17	11.985,93	14.679,82	470,96	100,00%	R\$	-	R\$	14.579,82
16.5	80529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALEMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	286,27	29,11	35,65	8.333,32	10.205,53	286,27	100,00%	R\$	-	R\$	10.205,53
16.6	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALEMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_03/2015	394,00	36,99	45,30	14.574,06	17.848,20	394,00	100,00%	R\$	-	R\$	-
16.7	511175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pilsen, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejunte epoxi, exclusivo regularização de base ou emboco - Rev 02	171,54	106,30	130,19	18.234,70	22.332,79	171,54	100,00%	R\$	-	R\$	22.332,79

Marquesa Marques da Sousa Guedes
 Engenheira Civil - CRP 0948/92
 CREA-PA 06170945-9
 22.332,79 R\$

16.8	8/27/25	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	273,63	76,62	93,84	20.965,53	25.677,44	273,63	100,00%	R\$	25.677,44	25.677,44
17	PAVIMENTAÇÃO	AF 06/2014				83.441,86	102.188,04	273,63	100,00%	R\$	29.239,43	54.911,51
17.1	99560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF 06/2018	413,25	39,17	47,97	16.187,00	19.823,60	413,25	100,00%	R\$	19.823,60	19.823,60
17.2	161750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	413,25	43,63	53,43	18.020,10	22.079,95	413,25	100,00%	R\$	-	22.079,95
17.3	SC2187	Polidimento de piso de alta resistência (existente)	413,25	20,97	25,68	8.665,85	10.612,26	262,39	63,49%	R\$	6.738,18	6.738,18
17.4	99685	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM, AF 09/2020	296,33	51,31	62,84	15.204,69	18.621,38	0,00	0,00%	R\$	-	-
17.5	99241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LARGUEZ SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	85,92	26,67	32,66	2.291,49	2.806,15	85,92	100,00%	R\$	-	2.806,15
17.6	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LARGUEZ SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF 07/2019	4,37	146,86	179,86	641,78	785,99	4,37	100,00%	R\$	-	785,99
17.7	91396	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 12/2015	58,61	58,20	71,28	3.411,10	4.177,72	0,00	0,00%	R\$	-	-
17.8	SC2187	CERÂMICA 43X43CM, PEÇA, ARTELE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR	104,27	20,97	25,68	2.186,54	2.677,65	104,27	100,00%	R\$	2.677,65	2.677,65
17.9	161094	PISO PORCELÂNICO DE ALTA QUALIDADE, DE BORDA, AF 09/2020	79,48	174,33	213,50	13.855,75	16.968,98	0,00	0,00%	R\$	-	-
17.10	99304	ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 09/2020	200,24	14,82	18,15	2.967,56	3.634,36	0,00	0,00%	R\$	-	-
18	RODAPE E PETITIL	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, AF 05/2016				1.400,02	1.714,74			R\$	-	-
18.1	89649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACA TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF 08/2012	48,38	7,51	9,20	363,33	445,10	0,00	0,00%	R\$	-	-
18.2	99689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	12,18	73,12	89,55	890,60	1.090,72	0,00	0,00%	R\$	-	-
18.3	161965	PETITIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 4M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF 11/2020	1,49	98,05	120,08	146,09	178,92	0,00	0,00%	R\$	-	-
19	PINTURA	AF 11/2020				29.427,28	36.042,48			R\$	-	-
19.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF 09/2017	286,27	22,35	27,37	6.398,13	7.835,21	0,00	0,00%	R\$	-	-
19.2	99306	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 09/2016	394,00	11,69	14,32	4.605,86	5.642,08	0,00	0,00%	R\$	-	-
19.3	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	286,27	10,91	13,36	3.123,21	3.824,57	0,00	0,00%	R\$	-	-
19.4	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	394,00	12,36	15,14	4.609,84	5.965,16	0,00	0,00%	R\$	-	-
19.5	162489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, AF 09/2021	348,34	27,80	34,05	9.683,85	11.860,98	0,00	0,00%	R\$	-	-
19.6	160744	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLLO OU PINCELO SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020	83,21	8,97	10,99	746,39	914,48	0,00	0,00%	R\$	-	-
20	ELETRICA					42.176,10	51.647,76			R\$	4.606,02	4.606,02
20.1	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	8,95	25,27	30,95	226,17	277,00	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.2	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	2,00	16,61	20,34	33,22	40,68	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.3	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	35,80	18,36	22,49	657,29	805,14	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	31,55	14,75	18,06	465,36	569,79	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	48,20	11,02	13,50	531,16	650,70	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.6	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	2,00	9,39	11,50	18,78	23,00	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.7	161663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	33,00	21,18	25,94	698,94	856,02	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.8	161663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	52,00	21,18	25,94	1.101,36	1.348,88	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.9	161663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLIS, COM 1 1/4"	37,00	21,18	25,94	783,66	959,78	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.10	161663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLIS, COM 2"	131,00	21,18	25,94	2.774,58	3.398,14	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.11	00639212	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	4,00	1,47	1,80	5,88	7,20	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.12	00639208	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	4,00	1,60	1,96	6,40	7,84	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.13	00639178	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	4,00	3,14	3,85	12,56	15,40	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.14	00639174	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	4,00	1,86	2,28	7,44	9,12	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.15	00611945	BUCHA DE NYLON SEM LABA, S4	52,00	0,06	0,07	3,12	3,64	0,00	0,00%	R\$	-	-
20.16	00604375	BUCHA DE NYLON SEM LABA, S6	79,00	0,16	0,20	12,64	15,80	0,00	0,00%	R\$	-	-

Marquesa
 Engenharia Civil
 CREA/PA 061179945-5

20.17	91954	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 CURVA 90 GRAUS PARA TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -	2,00	9,89	12,11	19,78	24,22		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.18	91911	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	1,00	9,17	11,23	9,17	11,23		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.19	91875	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	6,00	4,45	5,45	26,70	32,70		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.20	91876	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	5,00	5,86	7,18	29,30	35,90		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.21	91875	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	52,00	3,38	4,14	175,76	215,28		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.22	COM-3789361	LUMINÁRIA LED DOWNLIGHT 4W DE EMBUTIR	4,00	250,78	307,13	1.003,12	1.228,52		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.23	512971	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k da light ou similar - Rev.01.11/2021	100,00	62,12	76,08	6.212,00	7.608,00		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.24	COM-16451001	LUMINÁRIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR	14,00	244,59	299,55	3.424,26	4.193,70		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.25	91609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	11,00	12,74	15,60	140,14	171,60		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.26	COM-30124905	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	11,00	48,01	58,80	528,11	646,80		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.27	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	81,00	24,65	30,19	1.996,65	2.445,39		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.28	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 26 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	9,00	44,79	54,85	403,11	493,65		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.29	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	14,00	20,87	25,56	292,18	357,84		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.30	91958	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	7,00	26,54	32,50	185,78	227,50		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.31	91969	INTERUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	1,00	59,84	73,29	59,84	73,29		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.32	161879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	3,00	522,26	639,61	1.566,78	1.918,83	3,00	3,00	100,00%	R\$	1.918,83	1.918,83
20.33	161512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (MÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF 07/2020	1,00	2.194,16	2.687,19	2.194,16	2.687,19	1,00	1,00	100,00%	R\$	2.687,19	2.687,19
20.34	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE, ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	14,80	27,20	33,31	402,56	492,99		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.35	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	3,70	22,98	28,14	85,03	104,12		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.36	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	190,00	15,17	18,58	2.886,30	3.530,20		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.37	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	166,00	8,36	10,24	1.387,76	1.699,84		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.38	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	143,70	5,95	7,29	855,02	1.047,57		0,00	0,00%	R\$	-	-
20.39	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	1.805,70	3,80	4,55	6.861,66	8.396,51		0,00	0,00%	R\$	-	-

Marquesa Marques de Sousa Guedes
 Engenharia Civil
 CREA-PB 161779445-9

20.40	91924	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	817,50	2,58	3,16	2.109,15	2.583,30			0,00	0,00%	R\$	-
20.41	91886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,30 M. AF_12/2021	2,00	131,95	161,60	263,90	323,20			0,00	0,00%	R\$	-
20.42	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) - PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	112,00	10,56	12,93	1.182,72	1.448,16			0,00	0,00%	R\$	-
20.43	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	68,17	83,49	68,17	83,49			0,00	0,00%	R\$	-
20.44	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	2,00	71,33	87,36	142,66	174,72			0,00	0,00%	R\$	-
20.45	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	78,64	96,31	78,64	96,31			0,00	0,00%	R\$	-
20.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM NAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	15,00	10,27	12,58	154,05	188,70			0,00	0,00%	R\$	-
20.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM NAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	8,00	10,69	13,09	85,52	104,72			0,00	0,00%	R\$	-
20.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM NAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	11,56	14,16	11,56	14,16			0,00%	0,00%	R\$	-
21	HIDRAULICAS												
21.1	81355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,34	15,29	18,73	5,20	6,37			0,34	100,00%	R\$	6,37
21.2	81402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	112,78	10,21	12,50	1.151,48	1.409,75			112,78	100,00%	R\$	-
21.3	81403	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,66	16,98	20,80	248,93	304,93			14,66	100,00%	R\$	-
21.4	81448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,63	17,75	21,74	472,68	578,94			26,63	100,00%	R\$	-
21.5	81449	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	73,53	19,57	23,97	1.438,98	1.762,51			73,53	100,00%	R\$	-
21.6	164032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	1,00	21,74	26,62	21,74	26,62			1,00	100,00%	R\$	-
21.7	81362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	6,72	8,23	26,88	32,92			4,00	100,00%	R\$	-
21.8	81366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	14,60	17,88	102,20	125,16			7,00	100,00%	R\$	-
21.9	91373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	11,17	13,68	134,04	164,16			12,00	100,00%	R\$	-
21.10	81408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	6,18	7,57	80,34	98,41			13,00	100,00%	R\$	-
21.11	81501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	12,06	14,77	12,06	14,77			1,00	100,00%	R\$	-
21.12	81410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,00	8,75	10,72	472,50	578,88			54,00	100,00%	R\$	-
21.13	81432	LUVA DE CORREIA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	29,72	36,40	416,08	509,60			14,00	100,00%	R\$	-
21.14	81379	LUVA DE CORREIA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	18,29	22,40	36,58	44,80			2,00	100,00%	R\$	-
21.15	81764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDAVEL, DN25MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,00	35,02	42,89	525,30	643,35			15,00	100,00%	R\$	-
21.16	91065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2012	16,00	40,01	49,00	640,16	784,00			16,00	100,00%	R\$	-
21.17	93068	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2012	2,00	56,59	69,31	113,18	138,62			2,00	100,00%	R\$	-
21.18	91071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2012	2,00	157,14	192,45	314,28	384,90			2,00	100,00%	R\$	-
21.19	81440	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	8,67	10,62	121,38	148,68			14,00	100,00%	R\$	-
21.20	81625	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	19,87	24,33	59,61	72,99			3,00	100,00%	R\$	-
21.21	81628	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	46,26	56,55	46,26	56,55			1,00	100,00%	R\$	-
21.22	81395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	9,39	11,50	75,12	92,00			8,00	100,00%	R\$	-
21.23	81398	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	14,04	17,19	56,16	68,76			4,00	100,00%	R\$	-

Marquesa Marquesa

Engenharia Civil

CREA-PR Nº 16779945-9

Marquês Marques
 Engenharia Civil
 CREA-PB 164779945-9

21.24	89442	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	11,04	13,52	22,08	27,04			2,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.25	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	18,23	22,33	18,23	22,33			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.26	88984	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	14,00	8,88	10,88	124,32	152,32			14,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.27	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	4,54	5,56	9,08	11,12			2,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.28	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	30,00	6,34	7,76	190,20	232,80			30,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.29	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	18,32	22,44	36,64	44,88			2,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.30	91703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	19,96	24,45	19,96	24,45			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.31	91707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	64,64	79,16	64,64	79,16			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.32	163042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	15,46	18,93	15,46	18,93			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.33	91495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	14,00	57,54	70,47	805,56	986,58			14,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.34	91498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	137,34	168,20	137,34	168,20			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.35	91792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	108,07	132,35	108,07	132,35			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.36	163042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	15,46	18,93	15,46	18,93			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.37	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	83,98	102,85	335,92	411,40			4,00	100,00%	R\$	-	R\$
21.38	162617	CANAL D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	3.629,25	4.444,74	3.629,25	4.444,74			0,00	0,00%	R\$	-	R\$
21.39	162619	CANAL D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	7.023,92	8.602,19	7.023,92	8.602,19			0,00	0,00%	R\$	-	R\$
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
22.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	29,25	17,15	21,00	501,64	614,25			29,25	100,00%	R\$	-	R\$
22.2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	37,79	22,91	28,06	865,77	1.060,39			37,79	100,00%	R\$	-	R\$
22.3	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,32	28,85	35,33	326,58	399,94			11,32	100,00%	R\$	-	R\$
22.4	162264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	88,09	20,31	24,87	1.789,11	2.190,80			88,09	100,00%	R\$	-	R\$
22.5	91687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	4,00	234,76	287,51	939,04	1.150,04			4,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.6	91679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	4,00	22,79	27,91	91,16	111,64			4,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.7	00601967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	10,00	14,65	17,94	146,50	179,40			10,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.8	89728	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	14,00	11,09	13,58	155,26	190,12			14,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	8,15	9,98	8,15	9,98			1,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	9,00	24,78	30,35	223,02	273,15			9,00	100,00%	R\$	-	R\$
22.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	25,00	9,44	11,56	236,00	289,00			25,00	100,00%	R\$	-	R\$

Marques Marques de Sousa

Engenharia Civil

CREA-RB 078177/2017


R\$ 8.125,26
 Marquesa Marques de Sousa
 Engenharia Civil
 CREA-RB Nº 179.799-0

22.12	89514	SOLIDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	14,00	7,31	8,95	102,34	125,30	14,00	100,00%	R\$	-	R\$	125,30
22.13	89797	UNIÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	4,00	48,80	59,77	195,20	239,08	4,00	100,00%	R\$	-	R\$	239,08
22.14	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	19,75	24,19	19,75	24,19	1,00	100,00%	R\$	-	R\$	24,19
22.15	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	21,72	26,60	108,60	133,00	5,00	100,00%	R\$	-	R\$	133,00
22.16	89707	CANAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	11,00	37,15	45,50	408,65	500,50	11,00	100,00%	R\$	500,50	R\$	500,50
22.17	89882	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,00	20,16	24,69	282,24	345,66	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
22.18	89882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	18,82	23,05	150,56	184,40	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
22.19	89883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	10,83	13,26	21,66	26,52	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
22.20	89879	VALVULA EM PLÁSTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	22,00	8,09	9,91	177,98	218,02	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
22.21	89877	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/27 X 1,1/27 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	47,69	58,41	95,38	116,82	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
22.22	99111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	7,00	43,34	53,08	303,38	371,56	7,00	100,00%	R\$	-	R\$	371,56
22.23	99107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20 X 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	1,00	214,69	267,93	214,69	267,93	1,00	100,00%	R\$	3.223,56	R\$	3.223,56
23	LOUÇAS E METAIS					12.216,92	14.966,02						
23.1	99471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA P.D SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	694,32	850,33	2.777,28	3.401,32	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
23.2	163018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1,1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	252,76	309,56	1.011,04	1.238,24	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
23.3	89941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	658,03	805,89	2.632,12	3.223,56	4,00	100,00%	R\$	3.223,56	R\$	3.223,56
23.4	89906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	54,17	66,34	216,68	265,36	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
23.5	99544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	24,88	30,47	99,52	121,88	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
23.6	160873	BARRA DE APOIO RÍGIDA EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	304,46	372,87	5.480,28	6.711,66	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24	BWC - INFANTIL (CRECHE 1 E II)				7.425,38	9.093,89							
24.1	160848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	502,28	615,14	1.004,56	1.230,28	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24.2	163018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1,1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	252,76	309,56	505,52	619,12	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24.3	89938	CUBA DE ENABUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	322,24	394,65	1.611,20	1.973,25	5,00	100,00%	R\$	1.973,25	R\$	1.973,25
24.4	89906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	54,17	66,34	270,85	331,70	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24.5	99544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	3,00	24,88	30,47	74,64	91,41	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24.6	160860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	101,07	122,78	202,14	247,56	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
24.7	COMH-09439188	BANCADEA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ONSE (107/19)	6,13	437,01	535,21	2.678,87	3.280,84	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA-PB N.º 61779945-9

24.8	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	1,92	561,25	687,36	1.077,60	1.319,73	1,92	1,92	100,00%	R\$	1.319,73	R\$	4.941,02	R\$	1.319,73	4.941,02
25	BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)																
25.1	954170	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2016	3,00	280,42	343,43	841,26	1.030,29	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
25.2	103018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	3,00	252,76	309,56	758,28	928,68	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
25.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	3,00	322,24	394,65	966,72	1.183,95	3,00	3,00	100,00%	R\$	1.183,95	R\$	1.183,95	R\$	1.183,95	1.183,95
25.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	3,00	54,17	66,34	162,51	199,02	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
25.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIVÃO, AF. 01/2020	3,00	24,88	30,47	74,64	91,41	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
25.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2,00	101,07	123,78	202,14	247,56	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
25.7	COMP-09439188	BANCADEA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	1,90	437,01	535,21	830,32	1.016,90	1,90	1,90	100,00%	R\$	1.016,90	R\$	1.016,90	R\$	1.016,90	1.016,90
25.8	COMP-09439188	BANCADEA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	5,12	437,00	535,19	2.237,44	2.740,17	5,12	5,12	100,00%	R\$	2.740,17	R\$	2.740,17	R\$	2.740,17	6.009,00
26	COZINHA - CIRCULAÇÃO - LACTÁRIO - DM - LAVANDERIA																
26.1	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	1,00	322,24	394,65	322,24	394,65	1,00	1,00	100,00%	R\$	394,65	R\$	394,65	R\$	394,65	394,65
26.2	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	4,00	724,46	887,25	2.897,84	3.549,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
26.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	5,00	54,17	66,34	270,85	331,70	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
26.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	11,00	39,66	48,57	436,26	534,27	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
26.5	COMP-09439188	BANCADEA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	10,49	437,01	535,21	4.584,23	5.614,35	10,49	10,49	100,00%	R\$	5.614,35	R\$	5.614,35	R\$	5.614,35	5.614,35
27	DIVERSOS																
27.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, P	4,00	320,22	392,17	1.280,88	1.568,68	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
27.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020, P	4,00	282,24	345,66	1.128,96	1.382,64	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
27.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021	12,00	55,58	68,07	666,96	816,84	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
27.4	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF. 04/2019	763,38	2,48	3,04	1.893,18	2.320,68	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
			VALOR BD TOTAL:		167.494,07		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO INCLUINDO O PERÍODO:		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:		R\$		R\$		108.974,95		597.232,07
			VALOR ORÇAMENTO:		745.431,95		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO INCLUINDO O PERÍODO:		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:		R\$		R\$		597.232,07		65,42%
			VALOR TOTAL:		912.926,02		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO INCLUINDO O PERÍODO:		TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:		R\$		R\$		597.232,07		65,42%


 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO
 MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
 CREA: 1620957507



 RESP. TÉCNICO FICHAÇÃO
 Marquesa Marques de Sousa Gueles
 Engenharia Civil
 CREA-PB 161779945-9

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CIN) CRIANÇAS										SINAPI: 09/2022 - COM DESONERAÇÃO									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO 2, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CUMPRIR CONVÊNIO COM O FNDE/MEC DO GOVERNO FEDERAL										BDI = 22,47%									
LOCAL: COREMAS - PB										BDI = 22,47%									
MEMORIAL DE CALCULO 08										MEMORIAL DE CALCULO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTI DADE															
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1		PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	M²																
1.1	93384	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA (EMPIMPADA, 100% BELLITE MBRILAS). AF. 04/2016	M2																
1.2	93384	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA (EMPIMPADA, 100% BELLITE MBRILAS). AF. 04/2016	M2																
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,80M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M																
MOVIMENTO DE TERRA																			
2		REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3																
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3																
2.2	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3																
2.3	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3																
2.4	96995	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3																
SAPATAS																			
3		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO	M3																
3.1	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4	M2																
3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALEDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3																
3.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
3.7	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
3.8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
3.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
VIGA BALDRAME																			
4		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FISCAS, LARES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2																
4.1	95240	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2																
4.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2																
4.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
4.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALEDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3																
4.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
4.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG																
PILARES																			
5		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM LARES, E= CONCRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2																
5.1	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM LARES, E= CONCRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2																
5.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
5.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALEDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3																
5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
5.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
5.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
5.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
VIGAS																			
6		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2																
6.1	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2																
6.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
6.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALEDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3																
6.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
6.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
6.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
6.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
6.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
6.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
VERGAS																			
7		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M																
7.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M																
7.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M																
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M																
LAJE PRÉ-MOLDADA																			
8		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2																
8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2																
8.2	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2																
8.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L. AF. 05/2021	M3																
8.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALEDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3																
8.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
8.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
8.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG																
ELEMENTOS VAZADOS																			
9		ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORRÓG) DE 7X5X5X5CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2																
9.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORRÓG) DE 7X5X5X5CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2																
ALVENARIA DE VEDAÇÃO																			
10		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2019	M2																
10.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2019	M2																
10.2	102253	DIVISÓRIA SANTANHA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2																
												</							

[illegible]

20.36	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M					
20.37	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M					
20.38	91978	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M					
20.39	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M					
20.40	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M					
20.41	97886	CAIXA DE FERRAGEM ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,300 X 3,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN					
20.42	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	UN					
20.43	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN					
20.44	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN					
20.45	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, 30mA	ORSE	un					
20.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN					
20.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN					
20.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN					
21	21 - HIDRÁULICAS								
21.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M					
21.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M					
21.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M					
21.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M					
21.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M					
21.6	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PRESSIONAL DE ÁGUA. AF. 08/2023	SINAPI	UN					
21.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.8	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.10	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.12	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.13	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.14	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN					
21.15	89764	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.16	93065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRIMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	SINAPI	UN					
21.17	93068	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRIMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	SINAPI	UN					
21.18	93071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRIMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	SINAPI	UN					
21.19	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.20	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.21	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.22	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.23	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.24	89442	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.25	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.26	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN					
21.27	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.28	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.29	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
21.30	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN					
21.31	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN					
21.32	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4"	SINAPI	UN					
21.33	94495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN					
21.34	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN					
21.35	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN					
21.36	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4"	SINAPI	UN					
21.37	89895	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN					
21.38	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN					
21.39	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN					
22	22 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
22.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M					
22.2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M					
22.3	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M					
22.4	102764	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	SINAPI	M					
22.5	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN					
22.6	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN					
22.7	00091967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN					
22.8	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN					
22.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN					
22.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN					
22.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN					
22.12	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE X ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN					
22.13	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN					

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA RJ 01/0000000-9


 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO
 MAYARA KETILLY MARTINS CUNHA
 CREA: 16208975/07

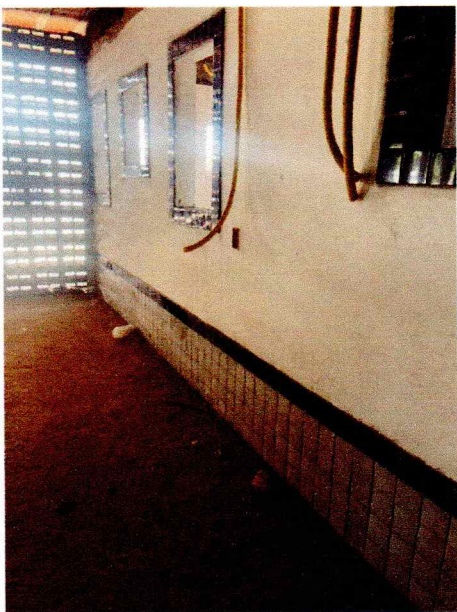
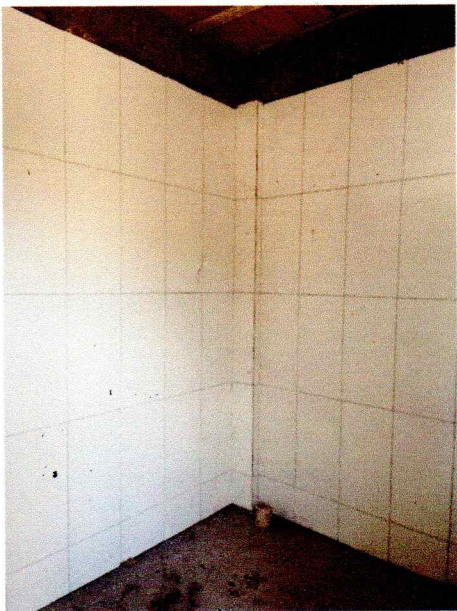
Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA-PR Nº 161779945-9

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM N° 08

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA.

PERÍODO: 22/01/2025 a 23/10/2025.

FOTO 01	FOTO 02
	
Legenda: Execução do revestimento cerâmico das paredes.	Legenda: Execução do revestimento cerâmico 10x10 nas paredes do recreio coberto.

FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Execução do revestimento cerâmico 10x10 nas paredes	Legenda: Execução do revestimento cerâmico das paredes.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM N° 08

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA.

PERÍODO: 22/01/2025 a 23/10/2025.

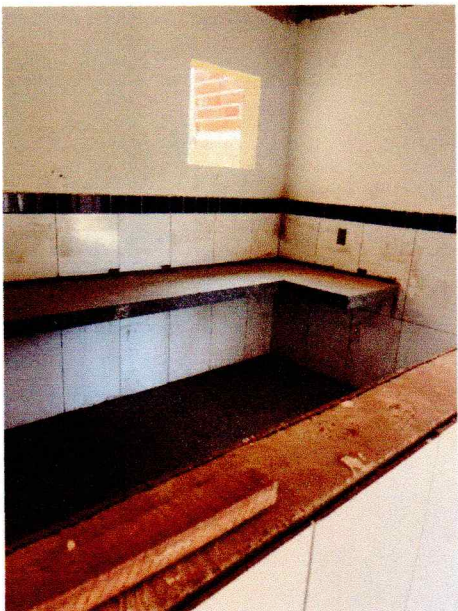
FOTO 05	FOTO 06
	
Legenda: Execução do revestimento cerâmico das paredes.	Legenda: Assentamento da bancada de granito.

FOTO 07	FOTO 08
	
Legenda: Assentamento da bancada de granito.	Legenda: Assentamento da bancada de granito das salas

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM Nº 08

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA.

PERÍODO: 22/01/2025 a 23/10/2025.

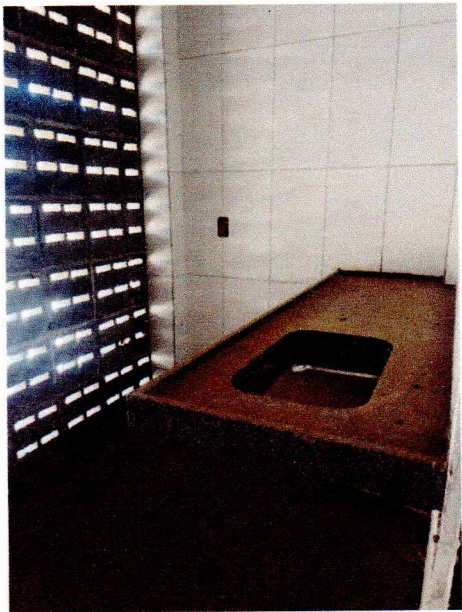
FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Instalação das prateleiras em granito.	Legenda: Assentamento da bancada de granito nas áreas molhadas.

FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Assentamento da bancada de granito nas áreas molhadas.	Legenda: Assentamento da bancada de granito e das pias.

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM N° 08

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA.

PERÍODO: 22/01/2025 a 23/10/2025.

FOTO 09	FOTO 10
	
Legenda: Assentamento da bancada de granito e das pias.	

Coremas-PB, 23 de Outubro de 2025.


 Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Marquesa Marques de Sousa Guedes
 Engenheira Civil
 CREA-PB 161779945-9


Mayara Kettily Martins Cunha

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço
 CREA nº 162248020-1
