


 CONTRATO: 83 9 9984-4752 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB.		BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES													
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.938/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 200811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos).				NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23											
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCs - COREMAS (PB) - 58770-000				FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =		R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =		R\$ 108.647,23					
MEDIÇÕES																			
AVANÇO																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.468,48	MEDIÇÃO 01						MEDIÇÃO 02					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	m²	8,00	R\$ 537,10	R\$ 4.296,80	100%	8,00	R\$ 4.296,80					100%	8,00	R\$ 4.296,80		
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	132,87	R\$ 71,74	R\$ 9.532,09	100%	132,87	R\$ 9.532,09					100%	132,87	R\$ 9.532,09		
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	m²	888,32	R\$ 0,72	R\$ 639,59	100%	888,32	R\$ 639,59					100%	888,32	R\$ 639,59		
2	QUIOSQUE						R\$ 94.029,07												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 997,18												
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	13,9	R\$ 71,74	R\$ 997,18	100%	13,9	R\$ 997,18					100%	13,90	R\$ 997,18		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.312,63												
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	m³	11,6	R\$ 96,82	R\$ 1.123,11	100%	11,6	R\$ 1.123,11					100%	11,60	R\$ 1.123,11		
2.2.1	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	m³	7,67	R\$ 24,71	R\$ 189,52	100%	7,67	R\$ 189,52					100%	7,67	R\$ 189,52		
2.3	FUNDAÇÃO						R\$ 13.917,39												
2.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	7,08	R\$ 44,90	R\$ 317,89	100%	7,08	R\$ 317,89					100%	7,08	R\$ 317,89		
2.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	m²	16,01	R\$ 7,07	R\$ 113,19	100%	16,01	R\$ 113,19					100%	16,01	R\$ 113,19		
2.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	3,93	R\$ 559,81	R\$ 2.200,05	100%	3,93	R\$ 2.200,05					100%	3,93	R\$ 2.200,05		
2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m³	3,93	R\$ 331,13	R\$ 1.301,34	100%	3,93	R\$ 1.301,34					100%	3,93	R\$ 1.301,34		
2.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	9,95	R\$ 93,61	R\$ 931,41	100%	9,95	R\$ 931,41					100%	9,95	R\$ 931,41		
2.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	33,68	R\$ 102,97	R\$ 3.468,02	100%	33,68	R\$ 3.468,02					100%	33,68	R\$ 3.468,02		
2.3.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	53,00	R\$ 17,40	R\$ 922,20	100%	53,00	R\$ 922,20					100%	53,00	R\$ 922,20		
2.3.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	52,90	R\$ 18,75	R\$ 991,87	100%	52,90	R\$ 991,87					100%	52,90	R\$ 991,87		
2.3.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	81,20	R\$ 16,16	R\$ 1.312,19	100%	81,20	R\$ 1.312,19					100%	81,20	R\$ 1.312,19		
2.3.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	m²	43,73	R\$ 53,95	R\$ 2.359,23	100%	43,73	R\$ 2.359,23					100%	43,73	R\$ 2.359,23		
2.4	ESTRUTURA						R\$ 15.491,80												
2.4.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	m²	57,56	R\$ 82,09	R\$ 4.725,10	100%	57,56	R\$ 4.725,10					100%	57,56	R\$ 4.725,10		
2.4.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	m²	12,90	R\$ 101,44	R\$ 1.308,57	100%	12,90	R\$ 1.308,57					100%	12,90	R\$ 1.308,57		
2.4.3	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	m²	6,04	R\$ 181,19	R\$ 1.094,38	100%	6,04	R\$ 1.094,38					100%	6,04	R\$ 1.094,38		
2.4.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	77,80	R\$ 15,87	R\$ 1.234,68				100%	77,80	R\$ 1.234,69	100%	77,80	R\$ 1.234,69			
2.4.5	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	172,60	R\$ 14,50	R\$ 2.502,70				100%	172,60	R\$ 2.502,70	100%	172,60	R\$ 2.502,70			
2.4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,20	R\$ 14,08	R\$ 397,05				100%	28,20	R\$ 397,06	100%	28,20	R\$ 397,06			
2.4.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	4,52	R\$ 559,81	R\$ 2.530,34				100%	4,52	R\$ 2.530,34	100%	4,52	R\$ 2.530,34			
2.4.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m³	4,52	R\$ 331,13	R\$ 1.496,70				100%	4,52	R\$ 1.496,71	100%	4,52	R\$ 1.496,71			
2.4.9	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,50	R\$ 15,31	R\$ 84,20				100%	5,50	R\$ 84,21	100%	5,50	R\$ 84,21			

 RANALTO ENGENHARIA CONTATO: 83 9 9984-4752	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB.						BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba	B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES								
	DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 200811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.681,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.	REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026	VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23								
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R. MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PIB) - 88770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =	R\$ 101.593,33	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =	R\$	108.647,23			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.4.10	92769	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	SINAPI	KG	8,20	R\$ 14,40	R\$ 118,08					100%	8,20	R\$ 118,08	100%	8,20	R\$ 118,08
2.5	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 4.869,94										
2.5.1	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_12/2021	SINAPI	m²	56,17	R\$ 67,73	R\$ 3.804,39					100%	56,17	R\$ 3.804,39	100%	56,17	R\$ 3.804,39
2.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM_AF_03/2024	SINAPI	M	8,10	R\$ 71,61	R\$ 580,04					100%	8,10	R\$ 580,04	100%	8,10	R\$ 580,04
2.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM_AF_03/2024	SINAPI	M	5,30	R\$ 53,87	R\$ 285,51					100%	5,30	R\$ 285,51	100%	5,30	R\$ 285,51
2.6	REVESTIMENTO						R\$ 12.028,40										
2.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_AF_10/2022	SINAPI	m²	56,17	R\$ 5,51	R\$ 309,49										
2.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E + 10MM, COM TALISCAS_AF_03/2024	SINAPI	m²	33,18	R\$ 32,41	R\$ 1.075,36										
2.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E + 17,5MM, COM TALISCAS_AF_03/2024	SINAPI	m²	33,18	R\$ 40,30	R\$ 1.337,15										
2.6.4	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	33,18	R\$ 74,90	R\$ 2.485,18										
2.6.5	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L_AF_10/2022	SINAPI	m²	47,35	R\$ 6,83	R\$ 323,40										
2.6.6	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME_AF_06/2022	SINAPI	m²	47,35	R\$ 61,59	R\$ 2.916,28										
2.6.7	13	REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	28,22	R\$ 76,79	R\$ 2.167,01										
2.6.8	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	13,64	R\$ 74,90	R\$ 1.021,63										
2.6.9	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 3 DEMÃOS_AF_09/2023	SINAPI	m²	10,00	R\$ 39,29	R\$ 392,90										
2.7	FORRO						R\$ 913,62										
2.7.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO_AF_08/2023_PS	SINAPI	m²	9,6	R\$ 73,09	R\$ 701,66										
2.7.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)_AF_08/2023	SINAPI	M	18,4	R\$ 11,52	R\$ 211,96										
2.8	PISO						R\$ 1.505,66										
2.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM_AF_01/2024	SINAPI	m²	9,60	R\$ 41,55	R\$ 398,88					100%	9,60	R\$ 398,88	100%	9,60	R\$ 398,88
2.8.2	87822	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM_AF_07/2021	SINAPI	m²	9,60	R\$ 40,39	R\$ 387,74					100%	9,60	R\$ 387,74	100%	9,60	R\$ 387,74
2.8.3	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	9,60	R\$ 74,90	R\$ 719,04										
2.9	INSTALAÇÕES						R\$ 14.710,26										
2.9.1	HIDRÁULICA						R\$ 3.931,82										
2.9.1.1	102907	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 550,67	R\$ 550,67					100%	1,00	R\$ 550,67	100%	1,00	R\$ 550,67
2.9.1.2	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78					100%	1,00	R\$ 52,78	100%	1,00	R\$ 52,78
2.9.1.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 591,21	R\$ 591,21					100%	1,00	R\$ 591,21	100%	1,00	R\$ 591,21
2.9.1.4	00001370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 141,46	R\$ 141,46					100%	1,00	R\$ 141,46	100%	1,00	R\$ 141,46
2.9.1.5	00010427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRILHO, DIMENSÕES "52 X 45" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 596,73	R\$ 596,73					100%	1,00	R\$ 596,73	100%	1,00	R\$ 596,73
2.9.1.6	00006136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 206,49	R\$ 206,49					100%	1,00	R\$ 206,49	100%	1,00	R\$ 206,49
2.9.1.7	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,04	R\$ 53,04					100%	1,00	R\$ 53,04	100%	1,00	R\$ 53,04

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB.							BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES												
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.938/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 205811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.691,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos).											NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23										
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCs - COREMAS (PB) - 88770-000											FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =		R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =		R\$ 108.647,23						

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PIB.						BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES									
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 200811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.661,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos).										NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000										FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =		R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =		R\$ 108.647,23			
								MEDIÇÕES				AVANÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO					
2.9.2.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 119,29	R\$ 119,29				100%	1,00	R\$ 119,29	100%	1,00	R\$ 119,29					
2.9.2.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 182,85	R\$ 182,85				100%	1,00	R\$ 182,85	100%	1,00	R\$ 182,85					
2.9.2.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 99,89	R\$ 99,89				100%	1,00	R\$ 99,89	100%	1,00	R\$ 99,89					
2.9.2.13	17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)	Próprio	UND	1,00	R\$ 71,30	R\$ 71,30				100%	1,00	R\$ 71,30	100%	1,00	R\$ 71,30					
2.9.2.14	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,88	R\$ 65,64				100%	3,00	R\$ 65,64	100%	3,00	R\$ 65,64					
2.9.2.15	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,61	R\$ 60,61				100%	1,00	R\$ 60,61	100%	1,00	R\$ 60,61					
2.9.2.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	127,80	R\$ 13,01	R\$ 1.662,67				100%	127,80	R\$ 1.662,68	100%	127,80	R\$ 1.662,68					
2.9.2.17	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	111,60	R\$ 3,72	R\$ 415,15				100%	111,60	R\$ 415,15	100%	111,60	R\$ 415,15					
2.9.2.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	27,20	R\$ 5,47	R\$ 148,78				100%	27,20	R\$ 148,78	100%	27,20	R\$ 148,78					
2.9.2.19	23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)	Próprio	M	38,76	R\$ 26,17	R\$ 1.014,34				100%	38,76	R\$ 1.014,35	100%	38,76	R\$ 1.014,35					
2.9.2.20	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	28,53	R\$ 22,30	R\$ 636,21				100%	28,53	R\$ 636,22	100%	28,53	R\$ 636,22					
2.9.2.21	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	21,31	R\$ 10,81	R\$ 230,36				100%	21,31	R\$ 230,36	100%	21,31	R\$ 230,36					
2.9.3		SANITÁRIAS																			
2.9.3.1	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.778,29	R\$ 3.778,29				100%	1,00	R\$ 3.778,29	100%	1,00	R\$ 3.778,29					
2.9.3.2	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 91,10	R\$ 91,10				100%	1,00	R\$ 91,10	100%	1,00	R\$ 91,10					
2.9.3.3	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 161,43	R\$ 161,43				100%	1,00	R\$ 161,43	100%	1,00	R\$ 161,43					
2.9.3.4	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36				100%	2,00	R\$ 52,36	100%	2,00	R\$ 52,36					
2.9.3.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85				100%	3,00	R\$ 32,85	100%	3,00	R\$ 32,85					
2.9.3.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 17,82	R\$ 89,10				100%	5,00	R\$ 89,10	100%	5,00	R\$ 89,10					
2.9.3.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,70	R\$ 21,40				100%	2,00	R\$ 21,40	100%	2,00	R\$ 21,40					
2.9.3.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 17,02	R\$ 136,16				100%	8,00	R\$ 136,16	100%	8,00	R\$ 136,16					
2.9.3.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,13	R\$ 31,13				100%	1,00	R\$ 31,13	100%	1,00	R\$ 31,13					
2.9.3.10	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,01	R\$ 30,01				100%	1,00	R\$ 30,01	100%	1,00	R\$ 30,01					
2.9.3.11	104363	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,81	R\$ 46,81				100%	1,00	R\$ 46,81	100%	1,00	R\$ 46,81					
2.9.3.12	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64				100%	1,00	R\$ 11,64	100%	1,00	R\$ 11,64					
2.9.3.13	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,82	R\$ 97,64				100%	2,00	R\$ 97,64	100%	2,00	R\$ 97,64					
2.9.3.14	00020181	TE, PVC, SÉRIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	R\$ 125,71	R\$ 125,71				100%	1,00	R\$ 125,71	100%	1,00	R\$ 125,71					
2.9.3.15	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,48	R\$ 77,48				100%	1,00	R\$ 77,48	100%	1,00	R\$ 77,48					


 PM PARAIBA MUNICÍPIO DE PARAIBA DE PARAIBA CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.						BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES							
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.938/0001-84 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº: 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).								NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCs - COREMAS (PB) - 58770-000								FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =		R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =		R\$ 108.647,23	
												MEDIÇÕES				AVANÇO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
2.9.3.16	00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,67	R\$ 21,34					100%	2,00	R\$ 21,34	100%	2,00	R\$ 21,34		
2.9.3.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,97	R\$ 23,31	R\$ 45,92					100%	1,97	R\$ 45,92	100%	1,97	R\$ 45,92		
2.9.3.18	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,86	R\$ 29,55	R\$ 232,26					100%	7,86	R\$ 232,26	100%	7,86	R\$ 232,26		
2.9.3.19	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,47	R\$ 36,79	R\$ 17,29					100%	0,47	R\$ 17,29	100%	0,47	R\$ 17,29		
2.9.3.20	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,83	R\$ 41,13	R\$ 75,26					100%	1,83	R\$ 75,27	100%	1,83	R\$ 75,27		
2.9.3.21	19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)	Próprio	M	4,31	R\$ 68,65	R\$ 295,88					100%	4,31	R\$ 295,88	100%	4,31	R\$ 295,88		
2.10	COBERTURA						R\$ 27.189,41												
2.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	m²	98,46	R\$ 52,95	R\$ 5.213,45												
2.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	m²	98,46	R\$ 92,74	R\$ 9.131,18												
2.10.3	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.159,15	R\$ 4.636,60												
2.10.4	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.568,57	R\$ 6.274,28												
2.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	m²	24,62	R\$ 13,54	R\$ 333,35												
2.10.6	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	47,20	R\$ 33,91	R\$ 1.600,55												
2.11	ESQUADRIAS						R\$ 1.292,78												
2.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 443,77	R\$ 887,54												
2.11.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	m²	0,20	R\$ 172,11	R\$ 34,42												
2.11.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 185,41	R\$ 370,82												
3	GUARITA						R\$ 48.294,65												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.054,57												
3.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	14,70	R\$ 71,74	R\$ 1.054,57	100%	14,70	R\$ 1.054,57		100%	14,70	R\$ 1.054,57					
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 438,91												
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	m³	3,88	R\$ 96,82	R\$ 375,66	100%	3,88	R\$ 375,66		100%	3,88	R\$ 375,66					
3.2.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	m³	2,56	R\$ 24,71	R\$ 63,25	100%	2,56	R\$ 63,25		100%	2,56	R\$ 63,25					
3.3	FUNDAÇÃO						R\$ 4.537,05												
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSEURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	2,38	R\$ 44,90	R\$ 106,86	100%	2,38	R\$ 106,86		100%	2,38	R\$ 106,86					
3.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	m³	4,61	R\$ 7,07	R\$ 32,59	100%	4,61	R\$ 32,59		100%	4,61	R\$ 32,59					
3.3.3	94971	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	1,32	R\$ 559,81	R\$ 738,94	100%	1,32	R\$ 738,94		100%	1,32	R\$ 738,94					
3.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m³	1,32	R\$ 331,13	R\$ 437,09	100%	1,32	R\$ 437,09		100%	1,32	R\$ 437,09					
3.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	3,10	R\$ 93,61	R\$ 290,19	100%	3,10	R\$ 290,19		100%	3,10	R\$ 290,19					
3.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	11,93	R\$ 102,97	R\$ 1.228,43	100%	11,93	R\$ 1.228,43		100%	11,93	R\$ 1.228,43					
3.3.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	17,60	R\$ 17,40	R\$ 306,24	100%	17,60	R\$ 306,24		100%	17,60	R\$ 306,24					

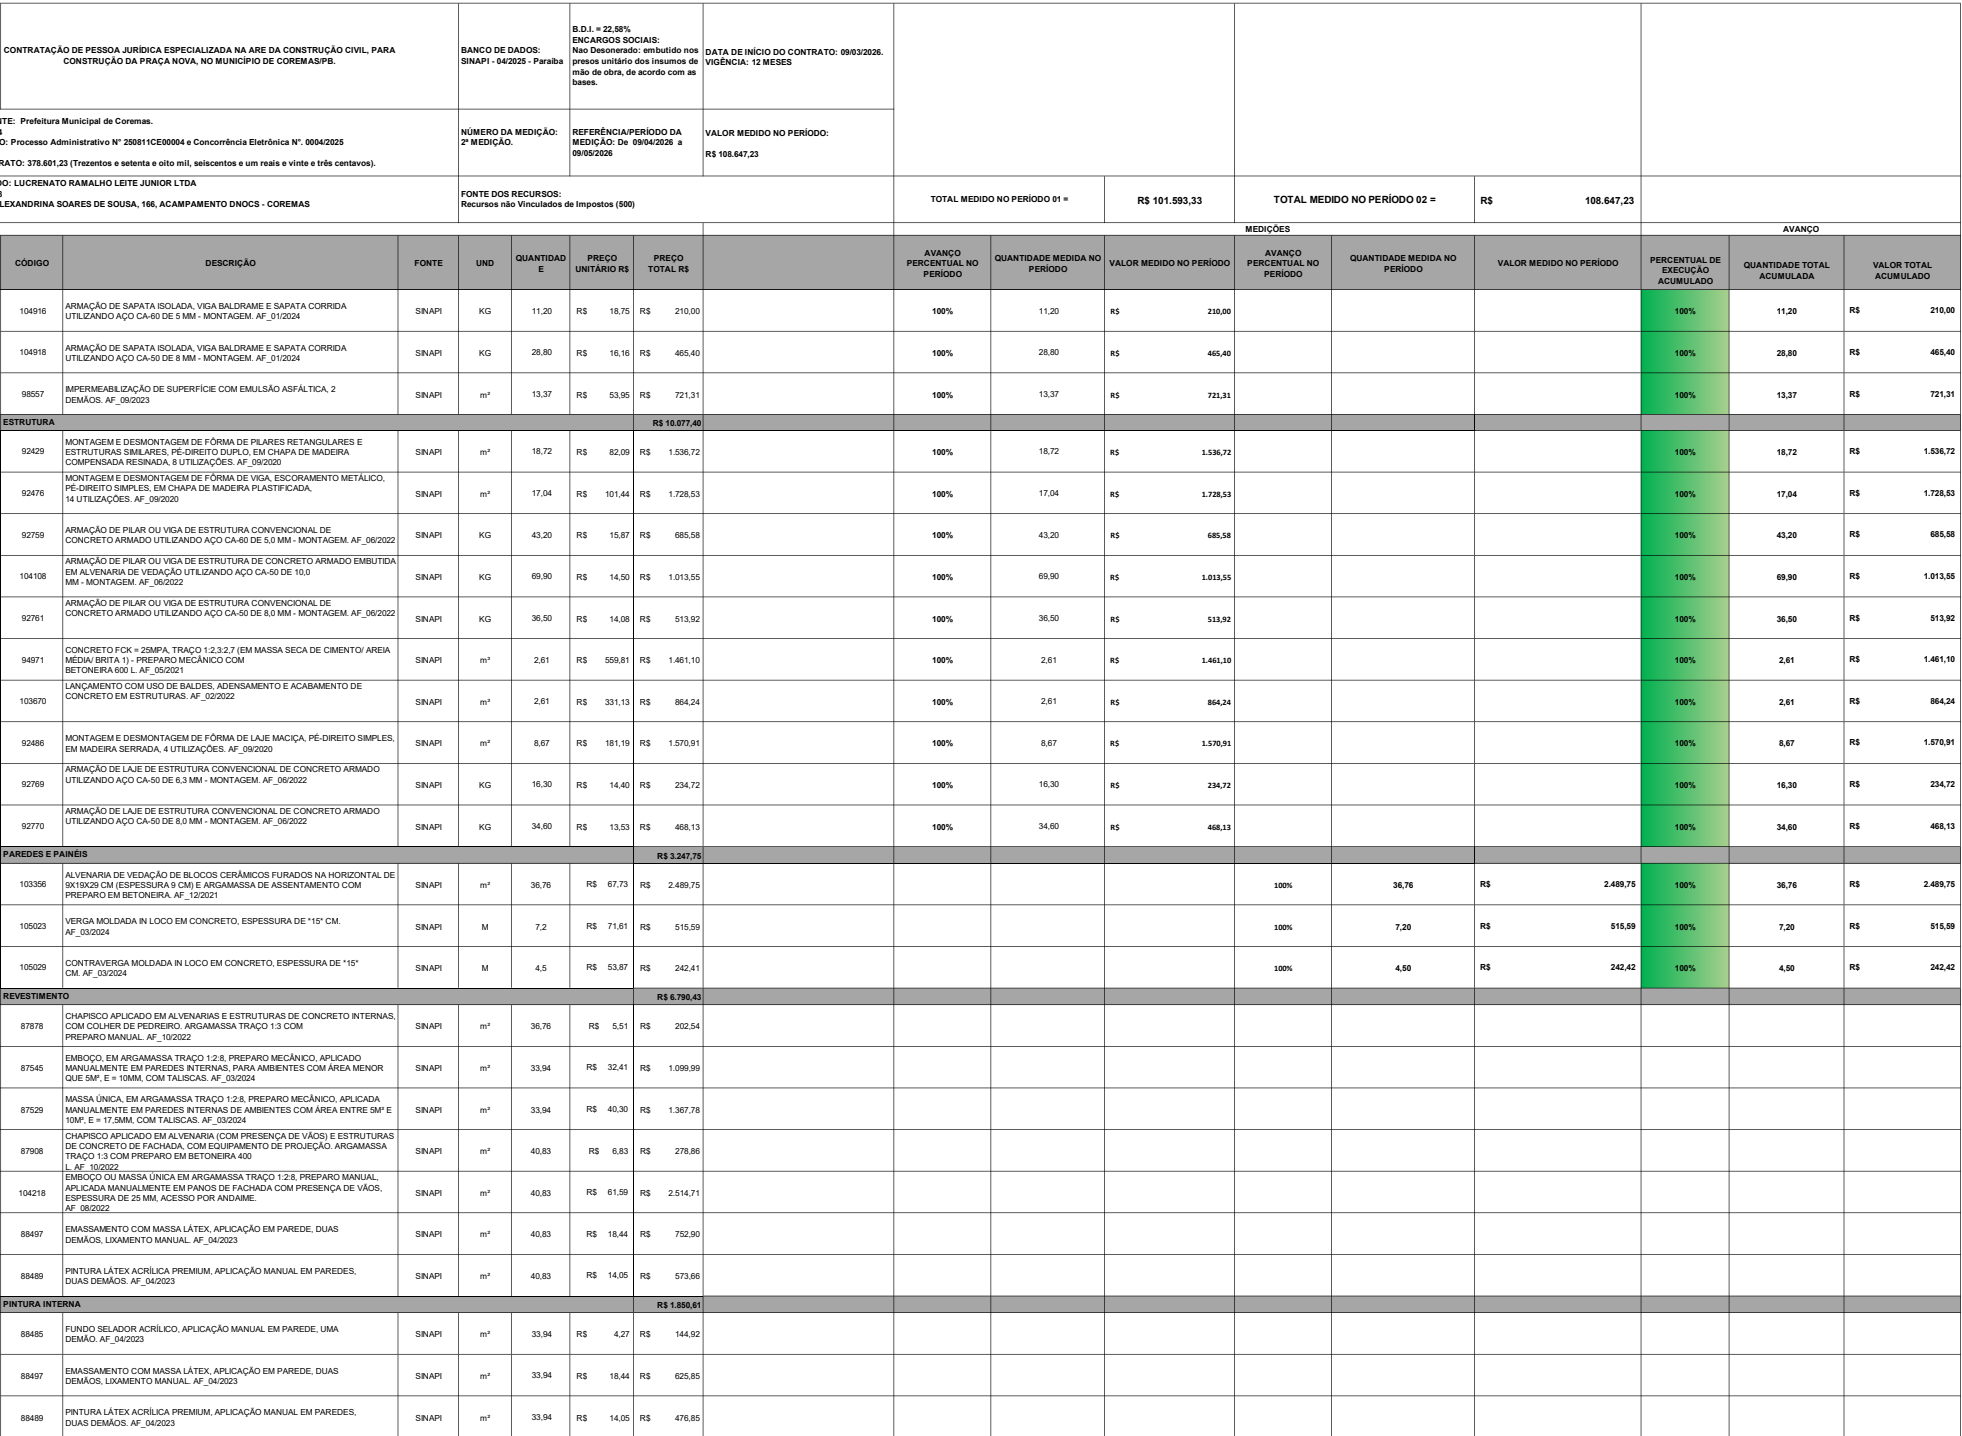

 </	
---	--

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.						BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES								
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 20081CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.691,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).								NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23								
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000								FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 = R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 = R\$ 108.647,23						
												MEDIÇÕES		AVANÇO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.9.1.23	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	26,14	R\$ 6,09	R\$ 159,19					100%	26,14	R\$ 159,19	100%	26,14	R\$ 159,19
3.9.1.24	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	2,62	R\$ 12,15	R\$ 31,83					100%	2,62	R\$ 31,83	100%	2,62	R\$ 31,83
3.9.2	ELETRICO									R\$ 3.965,19										
3.9.2.1	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,37	R\$ 32,74					100%	2,00	R\$ 32,74	100%	2,00	R\$ 32,74
3.9.2.2	95741	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,03	R\$ 16,03					100%	1,00	R\$ 16,03	100%	1,00	R\$ 16,03
3.9.2.3	104447	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,06	R\$ 44,24					100%	4,00	R\$ 44,24	100%	4,00	R\$ 44,24
3.9.2.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,16	R\$ 32,16					100%	1,00	R\$ 32,16	100%	1,00	R\$ 32,16
3.9.2.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,74	R\$ 54,74					100%	1,00	R\$ 54,74	100%	1,00	R\$ 54,74
3.9.2.6	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO				SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54					100%	1,00	R\$ 1,54	100%	1,00	R\$ 1,54
3.9.2.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 119,29	R\$ 119,29					100%	1,00	R\$ 119,29	100%	1,00	R\$ 119,29
3.9.2.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,99	R\$ 37,99					100%	1,00	R\$ 37,99	100%	1,00	R\$ 37,99
3.9.2.9	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,61	R\$ 60,61					100%	1,00	R\$ 60,61	100%	1,00	R\$ 60,61
3.9.2.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	16,60	R\$ 3,72	R\$ 61,75					100%	16,60	R\$ 61,75	100%	16,60	R\$ 61,75
3.9.2.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	52,20	R\$ 5,47	R\$ 285,53					100%	52,20	R\$ 285,53	100%	52,20	R\$ 285,53
3.9.2.12	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	112,20	R\$ 13,01	R\$ 1.459,72					100%	112,20	R\$ 1.459,72	100%	112,20	R\$ 1.459,72
3.9.2.13	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	33,45	R\$ 20,40	R\$ 682,38					100%	33,45	R\$ 682,38	100%	33,45	R\$ 682,38
3.9.2.14	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				SINAPI	M	2,28	R\$ 28,91	R\$ 65,91					100%	2,28	R\$ 65,91	100%	2,28	R\$ 65,91
3.9.2.15	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	18,31	R\$ 10,81	R\$ 197,93					100%	18,31	R\$ 197,93	100%	18,31	R\$ 197,93
3.9.2.16	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)				SINAPI	UN	1,00	R\$ 72,95	R\$ 72,95					100%	1,00	R\$ 72,95	100%	1,00	R\$ 72,95
3.9.2.17	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "30" KA (TIPO AC)				SINAPI	UN	1,00	R\$ 89,64	R\$ 89,64					100%	1,00	R\$ 89,64	100%	1,00	R\$ 89,64
3.9.2.18	16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)				Próprio	UND	1,00	R\$ 196,60	R\$ 196,60					100%	1,00	R\$ 196,60	100%	1,00	R\$ 196,60
3.9.2.19	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,41	R\$ 37,23					100%	3,00	R\$ 37,23	100%	3,00	R\$ 37,23
3.9.2.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,21	R\$ 16,21					100%	1,00	R\$ 16,21	100%	1,00	R\$ 16,21
3.9.3	SANITÁRIO									R\$ 7.039,64										
3.9.3.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 232,20	R\$ 232,20					100%	1,00	R\$ 232,20	100%	1,00	R\$ 232,20
3.9.3.2	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 72,98	R\$ 72,98					100%	1,00	R\$ 72,98	100%	1,00	R\$ 72,98
3.9.3.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85					100%	3,00	R\$ 32,85	100%	3,00	R\$ 32,85
3.9.3.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,82	R\$ 53,46					100%	3,00	R\$ 53,46	100%	3,00	R\$ 53,46

 </	
---	--

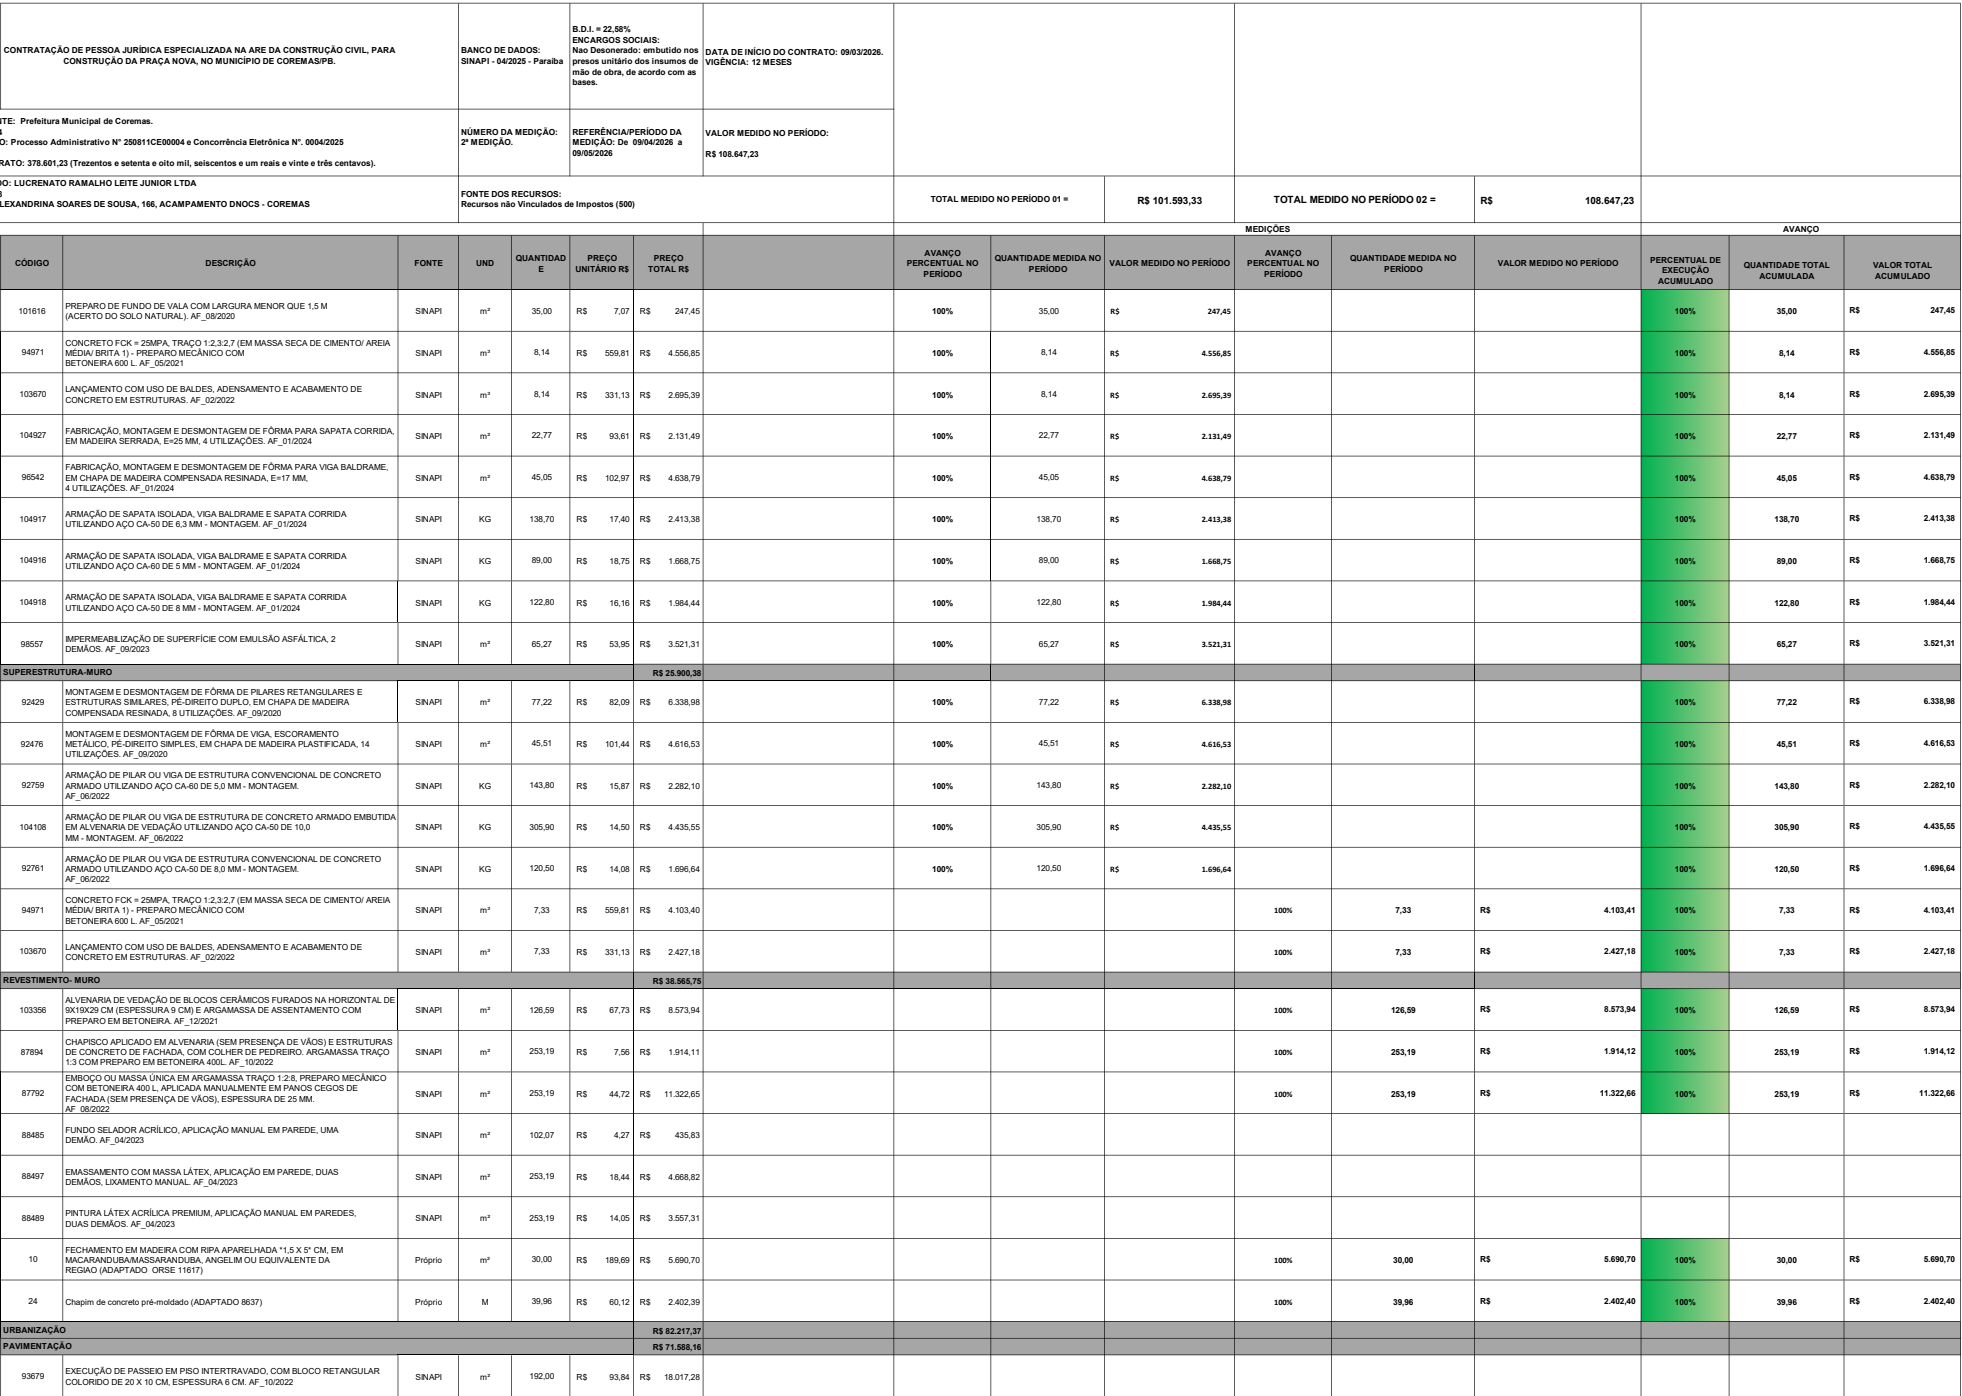

 RAMALHO ENGENHARIA PROJETOS PROJETOS PROJETOS PROJETOS PROJETOS CONTATO: 83 9 9984-4752 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PE.			BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,88% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).			NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23										
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOC5 - COREMAS (PB) - 58770-000			FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 =		R\$ 101.593,33		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 =		R\$ 108.647,23						
									MEDIÇÕES								
											AVANÇO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
5.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	SINAPI	M	132,02	R\$ 39,94	R\$ 5.272,87										
5.1.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	SINAPI	M	121,37	R\$ 43,06	R\$ 5.226,19										
5.1.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	m²	400,00	R\$ 73,92	R\$ 29.568,00										
5.1.5	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	SINAPI	m²	5,10	R\$ 134,67	R\$ 686,81										
5.1.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	SINAPI	M	253,39	R\$ 1,77	R\$ 448,50										
5.1.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	SINAPI	m²	38,00	R\$ 156,39	R\$ 5.942,82										
5.1.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	SINAPI	m²	1,00	R\$ 156,39	R\$ 156,39										
5.1.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	SINAPI	m²	5,10	R\$ 67,51	R\$ 344,30										
5.1.10	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	SINAPI	m²	250,00	R\$ 23,70	R\$ 5.925,00										
5.2	PAISAGISMO						R\$ 2.906,46										
5.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	SINAPI	m²	25,89	R\$ 23,70	R\$ 608,85										
5.2.2	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_ 07/2024	SINAPI	m²	25,89	R\$ 3,73	R\$ 95,82										
5.2.3	25	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)	Próprio	UND	3,00	R\$ 733,93	R\$ 2.201,79										
5.3	BANCOS						R\$ 7.722,76										
5.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	SINAPI	m³	1,92	R\$ 96,82	R\$ 185,89					100%	1,92	R\$ 185,89	100%	1,92	R\$ 185,89
5.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020	SINAPI	m³	6,40	R\$ 7,07	R\$ 45,24					100%	6,40	R\$ 45,25	100%	6,40	R\$ 45,25
5.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	m²	6,40	R\$ 44,90	R\$ 287,36					100%	6,40	R\$ 287,36	100%	6,40	R\$ 287,36
5.3.4	8	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) - ASSENTADO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (ADAPTADO DE SINAPI 73935/002)	Próprio	m²	1,92	R\$ 120,42	R\$ 231,20					100%	1,92	R\$ 231,21	100%	1,92	R\$ 231,21
5.3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	SINAPI	m²	14,40	R\$ 5,51	R\$ 79,34										
5.3.6	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 9M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	m²	14,40	R\$ 48,77	R\$ 702,28										
5.3.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	SINAPI	m²	14,40	R\$ 14,88	R\$ 214,27										
5.3.8	8	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) - ASSENTADO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (ADAPTADO DE SINAPI 73935/002)	Próprio	m²	14,40	R\$ 120,42	R\$ 1.734,04										
5.3.9	7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)	Próprio	m²	6,50	R\$ 652,79	R\$ 4.243,13										
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						R\$ 46.833,66										
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	SINAPI	m³	13,41	R\$ 96,82	R\$ 1.298,35					100%	13,41	R\$ 1.298,36	100%	13,41	R\$ 1.298,36
6.2	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 270,15	R\$ 4.052,25					100%	15,00	R\$ 4.052,25	100%	15,00	R\$ 4.052,25
6.3	20	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)	Próprio	UND	1,00	R\$ 8,85	R\$ 8,85					100%	1,00	R\$ 8,85	100%	1,00	R\$ 8,85
6.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,58	R\$ 55,74					100%	3,00	R\$ 55,74	100%	3,00	R\$ 55,74
6.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,01	R\$ 33,03					100%	3,00	R\$ 33,03	100%	3,00	R\$ 33,03

