


		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.											
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43				
MEDIÇÕES																AVANÇO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 14.468,48	MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				SINAPI	m²	8,00	R\$ 537,10	R\$ 4.296,80	R\$ 4.296,80						100%	8,00	R\$ 4.296,80
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024				SINAPI	M	132,87	R\$ 71,74	R\$ 9.532,09	R\$ 9.532,09						100%	132,87	R\$ 9.532,09
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024				SINAPI	m²	888,32	R\$ 0,72	R\$ 639,59	R\$ 639,59						100%	888,32	R\$ 639,59
2	QUIOSQUE									R\$ 94.029,07									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 997,18									
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024				SINAPI	M	13,9	R\$ 71,74	R\$ 997,18	R\$ 997,18						100%	13,90	R\$ 997,18
2.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 1.312,63									
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024				SINAPI	m³	11,6	R\$ 96,82	R\$ 1.123,11	R\$ 1.123,11						100%	11,60	R\$ 1.123,11
2.2.1	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023				SINAPI	m³	7,67	R\$ 24,71	R\$ 189,52	R\$ 189,52						100%	7,67	R\$ 189,52
2.3	FUNDAÇÃO									R\$ 13.917,39									
2.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				SINAPI	m²	7,08	R\$ 44,90	R\$ 317,89	R\$ 317,89						100%	7,08	R\$ 317,89
2.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020				SINAPI	m²	16,01	R\$ 7,07	R\$ 113,19	R\$ 113,19						100%	16,01	R\$ 113,19
2.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				SINAPI	m³	3,93	R\$ 559,81	R\$ 2.200,05	R\$ 2.200,05						100%	3,93	R\$ 2.200,05
2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022				SINAPI	m³	3,93	R\$ 331,13	R\$ 1.301,34	R\$ 1.301,34						100%	3,93	R\$ 1.301,34
2.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				SINAPI	m²	9,95	R\$ 93,61	R\$ 931,41	R\$ 931,41						100%	9,95	R\$ 931,41
2.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				SINAPI	m²	33,68	R\$ 102,97	R\$ 3.468,02	R\$ 3.468,02						100%	33,68	R\$ 3.468,02
2.3.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				SINAPI	KG	53,00	R\$ 17,40	R\$ 922,20	R\$ 922,20						100%	53,00	R\$ 922,20
2.3.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				SINAPI	KG	52,90	R\$ 18,75	R\$ 991,87	R\$ 991,87						100%	52,90	R\$ 991,87

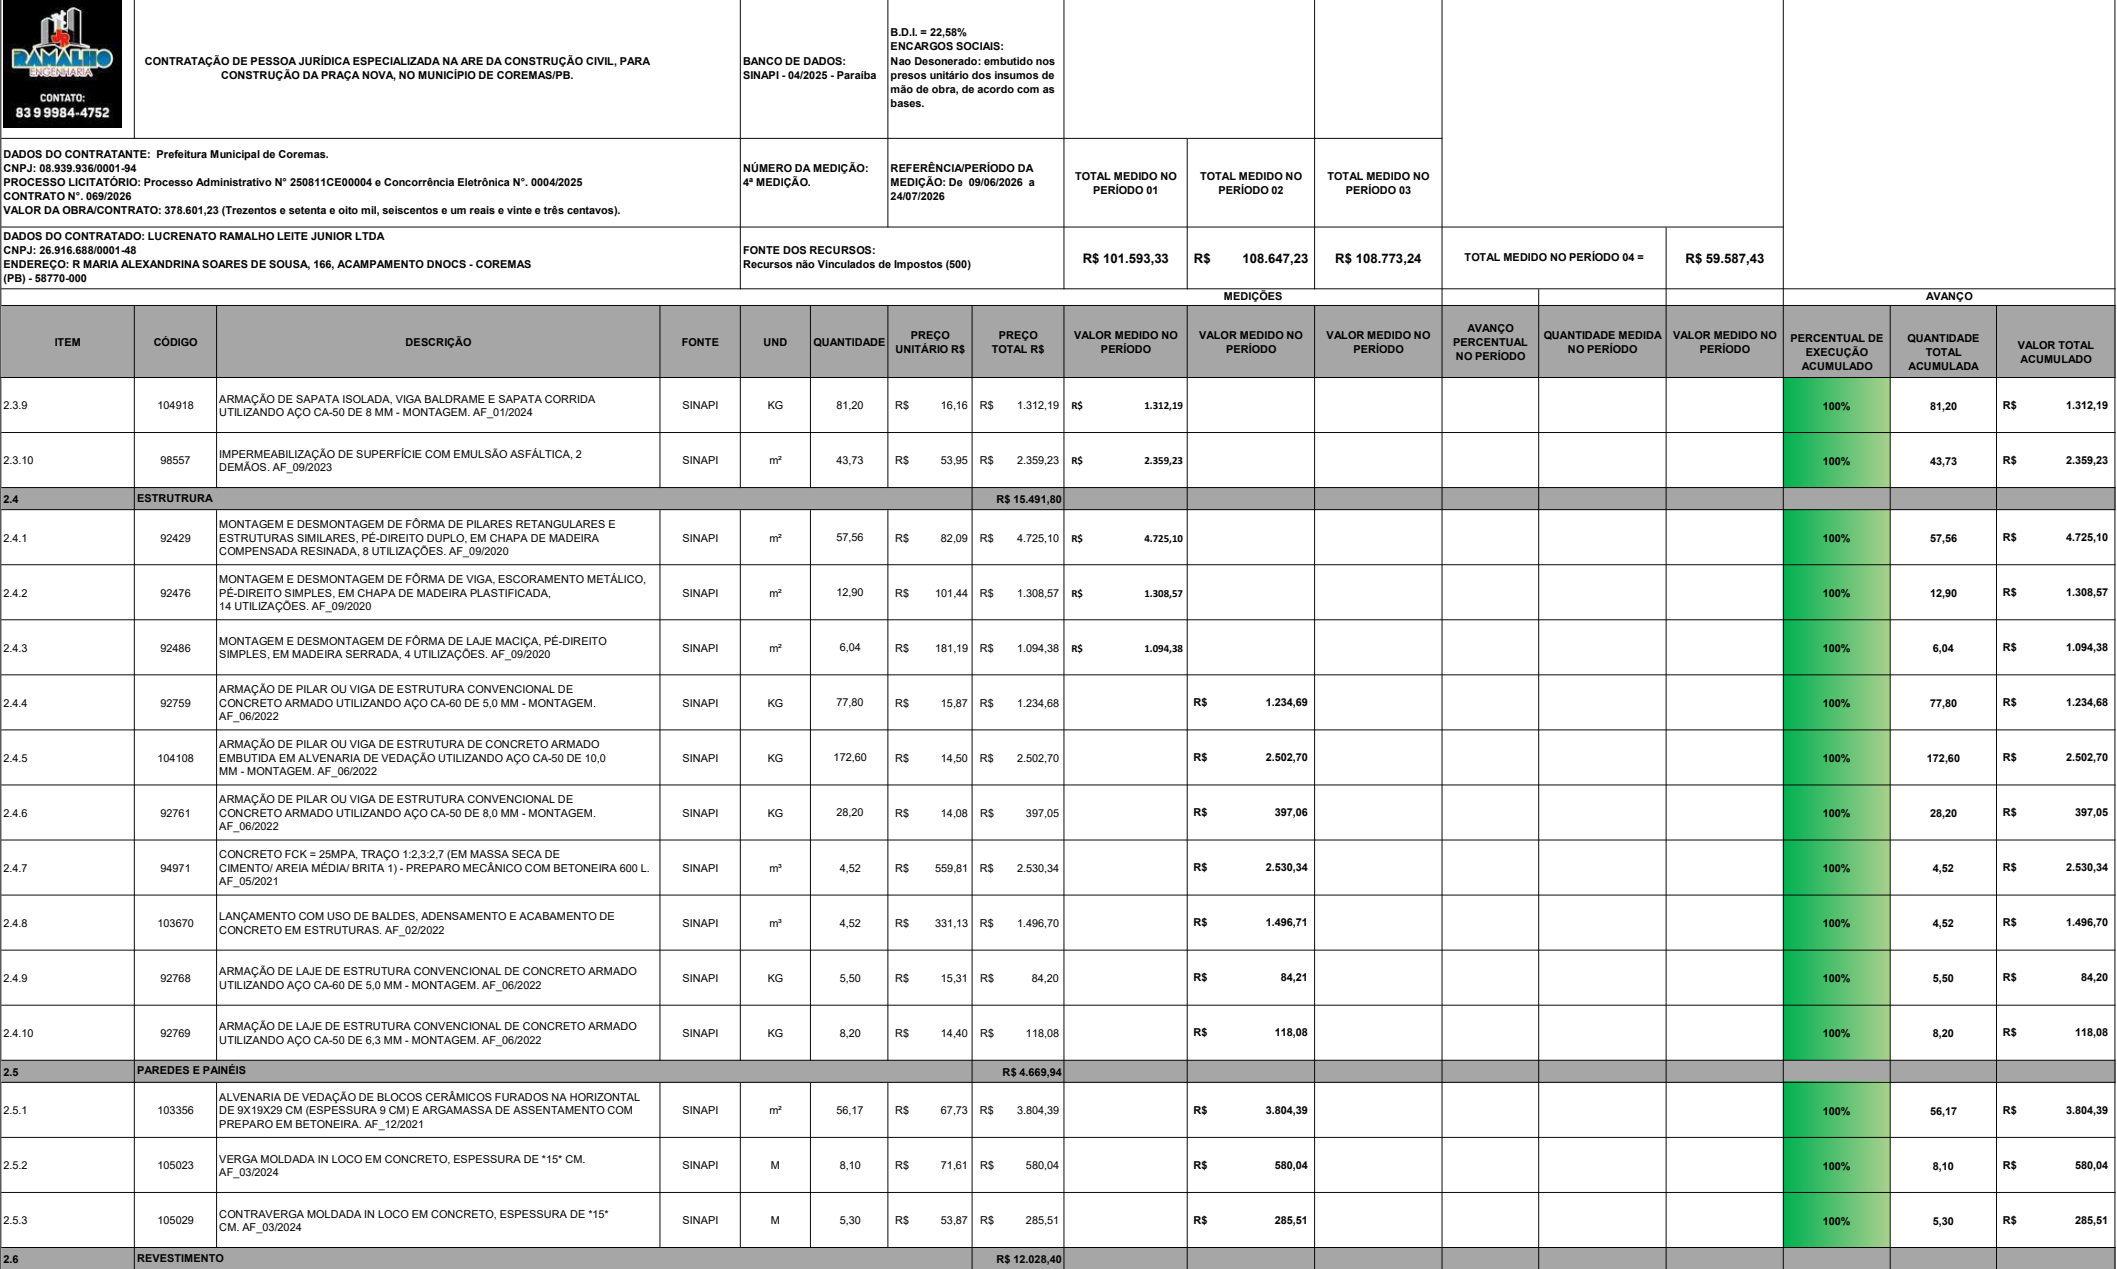


 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.		BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.													
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03			
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33		R\$ 108.647,23		R\$ 108.773,24		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 = R\$ 59.587,43	
MEDIÇÕES																AVANÇO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
2.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	m²	56,17	R\$ 5,51	R\$ 309,49			R\$ 309,50				100%	56,17	R\$ 309,49	
2.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	m²	33,18	R\$ 32,41	R\$ 1.075,36			R\$ 1.075,36				100%	33,18	R\$ 1.075,36	
2.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	m²	33,18	R\$ 40,30	R\$ 1.337,15			R\$ 1.337,15				100%	33,18	R\$ 1.337,15	
2.6.4	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	33,18	R\$ 74,90	R\$ 2.485,18				100%	33,18	R\$ 2.485,18	100%	33,18	R\$ 2.485,18	
2.6.5	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	m²	47,35	R\$ 6,83	R\$ 323,40			R\$ 323,40				100%	47,35	R\$ 323,40	
2.6.6	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	m²	47,35	R\$ 61,59	R\$ 2.916,28			R\$ 2.916,29				100%	47,35	R\$ 2.916,28	
2.6.7	13	REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MIRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	28,22	R\$ 76,79	R\$ 2.167,01				100%	28,22	R\$ 2.167,01	100%	28,22	R\$ 2.167,01	
2.6.8	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	13,64	R\$ 74,90	R\$ 1.021,63				100%	13,64	R\$ 1.021,63	100%	13,64	R\$ 1.021,63	
2.6.9	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	m²	10,00	R\$ 39,29	R\$ 392,90				100%	10,00	R\$ 392,90	100%	10,00	R\$ 392,90	
2.7	FORRO						R\$ 913,62										
2.7.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	m²	9,6	R\$ 73,09	R\$ 701,66				100%	9,60	R\$ 701,66	100%	9,60	R\$ 701,66	
2.7.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	18,4	R\$ 11,52	R\$ 211,96				100%	18,40	R\$ 211,96	100%	18,40	R\$ 211,96	
2.8	PISO						R\$ 1.505,66										
2.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	9,60	R\$ 41,55	R\$ 398,88		R\$ 398,88					100%	9,60	R\$ 398,88	
2.8.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	m²	9,60	R\$ 40,39	R\$ 387,74		R\$ 387,74					100%	9,60	R\$ 387,74	
2.8.3	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	9,60	R\$ 74,90	R\$ 719,04				100%	9,60	R\$ 719,04	100%	9,60	R\$ 719,04	
2.9	INSTALAÇÕES						R\$ 14.710,26										
2.9.1	HIDRÁULICA						R\$ 3.931,52										
2.9.1.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 550,67	R\$ 550,67		R\$ 550,67					100%	1,00	R\$ 550,67	

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.									
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03					
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43		
MEDIÇÕES															AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
2.9.1.2	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78		R\$ 52,78					100%	1,00	R\$ 52,78	
2.9.1.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 591,21	R\$ 591,21		R\$ 591,21					100%	1,00	R\$ 591,21	
2.9.1.4	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 141,46	R\$ 141,46		R\$ 141,46					100%	1,00	R\$ 141,46	
2.9.1.5	00010427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES "52 X 45" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 596,73	R\$ 596,73		R\$ 596,73					100%	1,00	R\$ 596,73	
2.9.1.6	00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 206,49	R\$ 206,49		R\$ 206,49					100%	1,00	R\$ 206,49	
2.9.1.7	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,04	R\$ 53,04		R\$ 53,04					100%	1,00	R\$ 53,04	
2.9.1.8	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 562,74	R\$ 562,74		R\$ 562,74					100%	1,00	R\$ 562,74	
2.9.1.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 112,25	R\$ 112,25		R\$ 112,25					100%	1,00	R\$ 112,25	
2.9.1.10	00013983	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 121,48	R\$ 121,48		R\$ 121,48					100%	1,00	R\$ 121,48	
2.9.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 115,36	R\$ 230,72		R\$ 230,72					100%	2,00	R\$ 230,72	
2.9.1.12	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,83	R\$ 109,66		R\$ 109,66					100%	2,00	R\$ 109,66	
2.9.1.13	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,72	R\$ 26,72		R\$ 26,72					100%	1,00	R\$ 26,72	
2.9.1.14	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3,57	R\$ 7,14		R\$ 7,14					100%	2,00	R\$ 7,14	
2.9.1.15	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,14	R\$ 10,14		R\$ 10,14					100%	1,00	R\$ 10,14	
2.9.1.16	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,66	R\$ 101,28		R\$ 101,28					100%	8,00	R\$ 101,28	
2.9.1.17	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,01	R\$ 30,01		R\$ 30,01					100%	1,00	R\$ 30,01	

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.											
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43				
MEDIÇÕES															AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.9.1.18	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	7,00	R\$ 10,94	R\$ 76,58		R\$ 76,58					100%	7,00	R\$ 76,58
2.9.1.19	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	7,00	R\$ 9,18	R\$ 64,26		R\$ 64,26					100%	7,00	R\$ 64,26
2.9.1.20	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,02	R\$ 17,02		R\$ 17,02					100%	1,00	R\$ 17,02
2.9.1.21	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024				SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,77	R\$ 22,77		R\$ 22,77					100%	1,00	R\$ 22,77
2.9.1.22	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,90	R\$ 23,70		R\$ 23,70					100%	3,00	R\$ 23,70
2.9.1.23	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024				SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,89	R\$ 24,89		R\$ 24,89					100%	1,00	R\$ 24,89
2.9.1.24	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	20,26	R\$ 6,09	R\$ 123,38		R\$ 123,38					100%	20,26	R\$ 123,38
2.9.1.25	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	3,61	R\$ 20,61	R\$ 74,40		R\$ 74,40					100%	3,61	R\$ 74,40
2.9.2	ELÉTRICA									R\$ 5.307,68									
2.9.2.1	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,58	R\$ 37,16		R\$ 37,16					100%	2,00	R\$ 37,16
2.9.2.2	91884	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,97	R\$ 47,88		R\$ 47,88					100%	4,00	R\$ 47,88
2.9.2.3	00039470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30" KA (TIPO AC)				SINAPI	UN	2,00	R\$ 89,64	R\$ 179,28		R\$ 179,28					100%	2,00	R\$ 179,28
2.9.2.4	16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)				Próprio	UND	1,00	R\$ 196,60	R\$ 196,60		R\$ 196,60					100%	1,00	R\$ 196,60
2.9.2.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,41	R\$ 12,41		R\$ 12,41					100%	1,00	R\$ 12,41
2.9.2.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,12	R\$ 13,12		R\$ 13,12					100%	1,00	R\$ 13,12
2.9.2.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,21	R\$ 16,21		R\$ 16,21					100%	1,00	R\$ 16,21
2.9.2.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,16	R\$ 32,16		R\$ 32,16					100%	1,00	R\$ 32,16

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.													
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03									
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43						
MEDIÇÕES															AVANÇO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
2.9.2.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 65,77	R\$ 65,77		R\$ 65,77					100%	1,00	R\$ 65,77		
2.9.2.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 119,29	R\$ 119,29		R\$ 119,29					100%	1,00	R\$ 119,29		
2.9.2.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 182,85	R\$ 182,85		R\$ 182,85					100%	1,00	R\$ 182,85		
2.9.2.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 99,89	R\$ 99,89		R\$ 99,89					100%	1,00	R\$ 99,89		
2.9.2.13	17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)				Próprio	UND	1,00	R\$ 71,30	R\$ 71,30		R\$ 71,30					100%	1,00	R\$ 71,30		
2.9.2.14	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,88	R\$ 65,64		R\$ 65,64					100%	3,00	R\$ 65,64		
2.9.2.15	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,61	R\$ 60,61		R\$ 60,61					100%	1,00	R\$ 60,61		
2.9.2.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	127,80	R\$ 13,01	R\$ 1.662,67		R\$ 1.662,68					100%	127,80	R\$ 1.662,67		
2.9.2.17	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	111,60	R\$ 3,72	R\$ 415,15		R\$ 415,15					100%	111,60	R\$ 415,15		
2.9.2.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	27,20	R\$ 5,47	R\$ 148,78		R\$ 148,78					100%	27,20	R\$ 148,78		
2.9.2.19	23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)				Próprio	M	38,76	R\$ 26,17	R\$ 1.014,34		R\$ 1.014,35					100%	38,76	R\$ 1.014,34		
2.9.2.20	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022				SINAPI	M	28,53	R\$ 22,30	R\$ 636,21		R\$ 636,22					100%	28,53	R\$ 636,21		
2.9.2.21	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	M	21,31	R\$ 10,81	R\$ 230,36		R\$ 230,36					100%	21,31	R\$ 230,36		
2.9.3		SANITÁRIAS								R\$ 5.471,06											
2.9.3.1	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.778,29	R\$ 3.778,29		R\$ 3.778,29					100%	1,00	R\$ 3.778,29		
2.9.3.2	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 91,10	R\$ 91,10		R\$ 91,10					100%	1,00	R\$ 91,10		
2.9.3.3	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 161,43	R\$ 161,43		R\$ 161,43					100%	1,00	R\$ 161,43		

 CONTRATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.									
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03					
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)			R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43			
MEDIÇÕES															AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
2.9.3.4	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36		R\$ 52,36					100%	2,00	R\$ 52,36	
2.9.3.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85		R\$ 32,85					100%	3,00	R\$ 32,85	
2.9.3.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 17,82	R\$ 89,10		R\$ 89,10					100%	5,00	R\$ 89,10	
2.9.3.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,70	R\$ 21,40		R\$ 21,40					100%	2,00	R\$ 21,40	
2.9.3.8	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 17,02	R\$ 136,16		R\$ 136,16					100%	8,00	R\$ 136,16	
2.9.3.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,13	R\$ 31,13		R\$ 31,13					100%	1,00	R\$ 31,13	
2.9.3.10	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,01	R\$ 30,01		R\$ 30,01					100%	1,00	R\$ 30,01	
2.9.3.11	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,81	R\$ 46,81		R\$ 46,81					100%	1,00	R\$ 46,81	
2.9.3.12	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64		R\$ 11,64					100%	1,00	R\$ 11,64	
2.9.3.13	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,82	R\$ 97,64		R\$ 97,64					100%	2,00	R\$ 97,64	
2.9.3.14	00020181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	R\$ 125,71	R\$ 125,71		R\$ 125,71					100%	1,00	R\$ 125,71	
2.9.3.15	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,48	R\$ 77,48		R\$ 77,48					100%	1,00	R\$ 77,48	
2.9.3.16	00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,67	R\$ 21,34		R\$ 21,34					100%	2,00	R\$ 21,34	
2.9.3.17	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,97	R\$ 23,31	R\$ 45,92		R\$ 45,92					100%	1,97	R\$ 45,92	
2.9.3.18	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,86	R\$ 29,55	R\$ 232,26		R\$ 232,26					100%	7,86	R\$ 232,26	
2.9.3.19	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,47	R\$ 36,79	R\$ 17,29		R\$ 17,29					100%	0,47	R\$ 17,29	

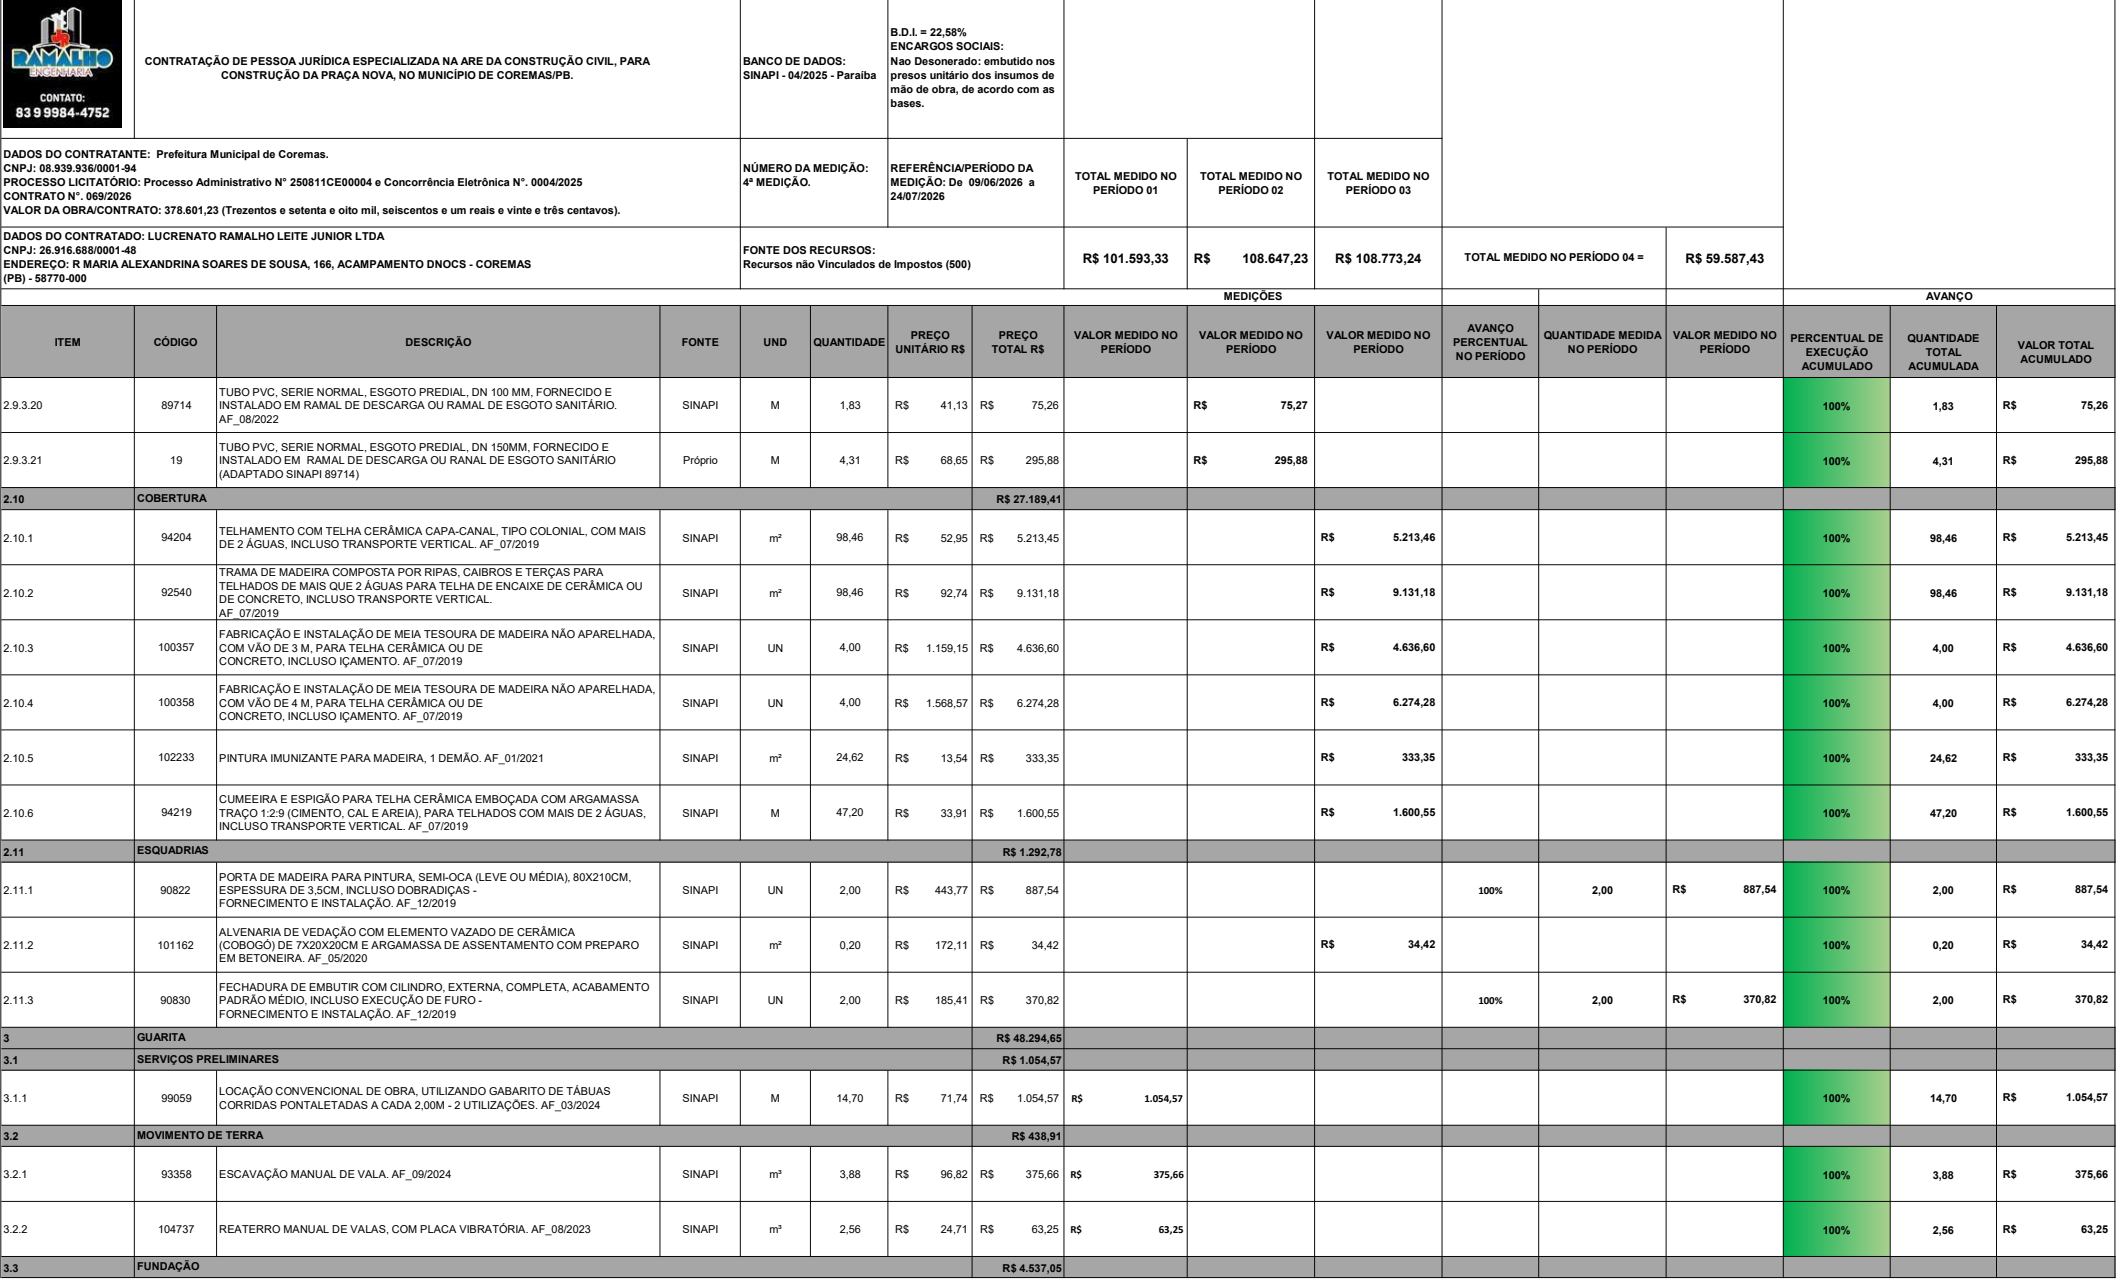

 CONATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.											
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43				
MEDIÇÕES															AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				SINAPI	m²	2,38	R\$ 44,90	R\$ 106,86	R\$ 106,86						100%	2,38	R\$ 106,86
3.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020				SINAPI	m²	4,61	R\$ 7,07	R\$ 32,59	R\$ 32,59						100%	4,61	R\$ 32,59
3.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				SINAPI	m³	1,32	R\$ 559,81	R\$ 738,94	R\$ 738,94						100%	1,32	R\$ 738,94
3.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022				SINAPI	m³	1,32	R\$ 331,13	R\$ 437,09	R\$ 437,09						100%	1,32	R\$ 437,09
3.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				SINAPI	m²	3,10	R\$ 93,61	R\$ 290,19	R\$ 290,19						100%	3,10	R\$ 290,19
3.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				SINAPI	m²	11,93	R\$ 102,97	R\$ 1.228,43	R\$ 1.228,43						100%	11,93	R\$ 1.228,43
3.3.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				SINAPI	KG	17,60	R\$ 17,40	R\$ 306,24	R\$ 306,24						100%	17,60	R\$ 306,24
3.3.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				SINAPI	KG	11,20	R\$ 18,75	R\$ 210,00	R\$ 210,00						100%	11,20	R\$ 210,00
3.3.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				SINAPI	KG	28,80	R\$ 16,16	R\$ 465,40	R\$ 465,40						100%	28,80	R\$ 465,40
3.3.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023				SINAPI	m²	13,37	R\$ 53,95	R\$ 721,31	R\$ 721,31						100%	13,37	R\$ 721,31
3.4	ESTRUTURA									R\$ 10.077,40									
3.4.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				SINAPI	m²	18,72	R\$ 82,09	R\$ 1.536,72	R\$ 1.536,72						100%	18,72	R\$ 1.536,72
3.4.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				SINAPI	m²	17,04	R\$ 101,44	R\$ 1.728,53	R\$ 1.728,53						100%	17,04	R\$ 1.728,53
3.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				SINAPI	KG	43,20	R\$ 15,87	R\$ 685,58	R\$ 685,58						100%	43,20	R\$ 685,58
3.4.4	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				SINAPI	KG	69,90	R\$ 14,50	R\$ 1.013,55	R\$ 1.013,55						100%	69,90	R\$ 1.013,55
3.4.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				SINAPI	KG	36,50	R\$ 14,08	R\$ 513,92	R\$ 513,92						100%	36,50	R\$ 513,92
3.4.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021				SINAPI	m³	2,61	R\$ 559,81	R\$ 1.461,10	R\$ 1.461,10						100%	2,61	R\$ 1.461,10

 CONTRATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.												
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03								
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43					
MEDIÇÕES															AVANÇO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
3.4.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022				SINAPI	m³	2,61	R\$ 331,13	R\$ 864,24	R\$ 864,24						100%	2,61	R\$ 864,24	
3.4.8	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				SINAPI	m²	8,67	R\$ 181,19	R\$ 1.570,91	R\$ 1.570,91						100%	8,67	R\$ 1.570,91	
3.4.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				SINAPI	KG	16,30	R\$ 14,40	R\$ 234,72	R\$ 234,72						100%	16,30	R\$ 234,72	
3.4.10	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				SINAPI	KG	34,60	R\$ 13,53	R\$ 468,13	R\$ 468,13						100%	34,60	R\$ 468,13	
3.5		PAREDES E PAINÉIS								R\$ 3.247,75										
3.5.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				SINAPI	m²	36,76	R\$ 67,73	R\$ 2.489,75	R\$ 2.489,75						100%	36,76	R\$ 2.489,75	
3.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024				SINAPI	M	7,2	R\$ 71,61	R\$ 515,59	R\$ 515,59						100%	7,20	R\$ 515,59	
3.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024				SINAPI	M	4,5	R\$ 53,87	R\$ 242,41	R\$ 242,42						100%	4,50	R\$ 242,41	
3.6		REVESTIMENTO								R\$ 6.790,43										
3.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				SINAPI	m²	36,76	R\$ 5,51	R\$ 202,54		R\$ 202,55					100%	36,76	R\$ 202,54	
3.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				SINAPI	m²	33,94	R\$ 32,41	R\$ 1.099,99		R\$ 1.100,00					100%	33,94	R\$ 1.099,99	
3.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				SINAPI	m²	33,94	R\$ 40,30	R\$ 1.367,78		R\$ 1.367,78					100%	33,94	R\$ 1.367,78	
3.6.4	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022				SINAPI	m²	40,83	R\$ 6,83	R\$ 278,86		R\$ 278,87					100%	40,83	R\$ 278,86	
3.6.5	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022				SINAPI	m²	40,83	R\$ 61,59	R\$ 2.514,71		R\$ 2.514,72					100%	40,83	R\$ 2.514,71	
3.6.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023				SINAPI	m²	40,83	R\$ 18,44	R\$ 752,90			100%	40,83	R\$ 752,90	100%	40,83	R\$ 752,90		
3.6.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				SINAPI	m²	40,83	R\$ 14,05	R\$ 573,66			100%	40,83	R\$ 573,66	100%	40,83	R\$ 573,66		
3.7		PINTURA INTERNA								R\$ 1.850,61										
3.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				SINAPI	m²	33,94	R\$ 4,27	R\$ 144,92			100%	33,94	R\$ 144,92	100%	33,94	R\$ 144,92		

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.											
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03					
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		R\$ 101.593,33		R\$ 108.647,23		R\$ 108.773,24		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43			
MEDIÇÕES																		AVANÇO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO			
3.7.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	33,94	R\$ 18,44	R\$ 625,85				100%	33,94	R\$ 625,85	100%	33,94	R\$ 625,85			
3.7.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	33,94	R\$ 14,05	R\$ 476,85				100%	33,94	R\$ 476,85	100%	33,94	R\$ 476,85			
3.7.4	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	m²	8,25	R\$ 73,09	R\$ 602,99				100%	8,25	R\$ 602,99	100%	8,25	R\$ 602,99			
3.8	PISO							R\$ 1.293,91											
3.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	8,25	R\$ 41,55	R\$ 342,78		R\$ 342,79					100%	8,25	R\$ 342,78			
3.8.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	m²	8,25	R\$ 40,39	R\$ 333,21		R\$ 333,22					100%	8,25	R\$ 333,21			
3.8.3	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)	Próprio	m²	8,25	R\$ 74,90	R\$ 617,92				100%	8,25	R\$ 617,92	100%	8,25	R\$ 617,92			
3.9	INSTALAÇÕES							R\$ 13.670,03											
3.9.1	HIDRÁULICA							R\$ 3.065,20											
3.9.1.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 554,88	R\$ 554,88		R\$ 554,88					100%	1,00	R\$ 554,88			
3.9.1.2	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 75,85	R\$ 75,85		R\$ 75,85					100%	1,00	R\$ 75,85			
3.9.1.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 591,21	R\$ 591,21		R\$ 591,21					100%	1,00	R\$ 591,21			
3.9.1.4	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 141,46	R\$ 141,46		R\$ 141,46					100%	1,00	R\$ 141,46			
3.9.1.5	10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45" CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 596,73	R\$ 596,73		R\$ 596,73					100%	1,00	R\$ 596,73			
3.9.1.6	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$ 206,49	R\$ 206,49		R\$ 206,49					100%	1,00	R\$ 206,49			
3.9.1.7	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,04	R\$ 53,04		R\$ 53,04					100%	1,00	R\$ 53,04			
3.9.1.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 120,45	R\$ 120,45		R\$ 120,45					100%	1,00	R\$ 120,45			
3.9.1.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 115,36	R\$ 115,36		R\$ 115,36					100%	1,00	R\$ 115,36			

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.											
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03							
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43				
MEDIÇÕES															AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.9.1.10	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				SINAPI	UN	1,00	R\$ 40,01	R\$ 40,01		R\$ 40,01					100%	1,00	R\$ 40,01
3.9.1.11	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,72	R\$ 26,72		R\$ 26,72					100%	1,00	R\$ 26,72
3.9.1.12	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,07	R\$ 39,07		R\$ 39,07					100%	1,00	R\$ 39,07
3.9.1.13	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024				SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57		R\$ 3,57					100%	1,00	R\$ 3,57
3.9.1.14	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	7,00	R\$ 12,66	R\$ 88,62		R\$ 88,62					100%	7,00	R\$ 88,62
3.9.1.15	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,04	R\$ 24,08		R\$ 24,08					100%	2,00	R\$ 24,08
3.9.1.16	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,94	R\$ 21,88		R\$ 21,88					100%	2,00	R\$ 21,88
3.9.1.17	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,18	R\$ 55,08		R\$ 55,08					100%	6,00	R\$ 55,08
3.9.1.18	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,93	R\$ 41,79		R\$ 41,79					100%	3,00	R\$ 41,79
3.9.1.19	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42		R\$ 4,42					100%	1,00	R\$ 4,42
3.9.1.20	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,55	R\$ 13,55		R\$ 13,55					100%	1,00	R\$ 13,55
3.9.1.21	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	6,00	R\$ 7,90	R\$ 47,40		R\$ 47,40					100%	6,00	R\$ 47,40
3.9.1.22	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,52	R\$ 12,52		R\$ 12,52					100%	1,00	R\$ 12,52
3.9.1.23	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	26,14	R\$ 6,09	R\$ 159,19		R\$ 159,19					100%	26,14	R\$ 159,19
3.9.1.24	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				SINAPI	M	2,62	R\$ 12,15	R\$ 31,83		R\$ 31,83					100%	2,62	R\$ 31,83
3.9.2	ELÉTRICO									R\$ 3.565,19									
3.9.2.1	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,37	R\$ 32,74		R\$ 32,74					100%	2,00	R\$ 32,74

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03						
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43			
MEDIÇÕES																AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
3.9.2.2	95741	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,03	R\$ 16,03		R\$ 16,03					100%	1,00	R\$ 16,03		
3.9.2.3	104447	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,06	R\$ 44,24		R\$ 44,24					100%	4,00	R\$ 44,24		
3.9.2.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,16	R\$ 32,16		R\$ 32,16					100%	1,00	R\$ 32,16		
3.9.2.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 54,74	R\$ 54,74		R\$ 54,74					100%	1,00	R\$ 54,74		
3.9.2.6	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54		R\$ 1,54					100%	1,00	R\$ 1,54		
3.9.2.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 119,29	R\$ 119,29		R\$ 119,29					100%	1,00	R\$ 119,29		
3.9.2.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 37,99	R\$ 37,99		R\$ 37,99					100%	1,00	R\$ 37,99		
3.9.2.9	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,61	R\$ 60,61		R\$ 60,61					100%	1,00	R\$ 60,61		
3.9.2.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	16,60	R\$ 3,72	R\$ 61,75		R\$ 61,75					100%	16,60	R\$ 61,75		
3.9.2.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	52,20	R\$ 5,47	R\$ 285,53		R\$ 285,53					100%	52,20	R\$ 285,53		
3.9.2.12	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	112,20	R\$ 13,01	R\$ 1.459,72		R\$ 1.459,72					100%	112,20	R\$ 1.459,72		
3.9.2.13	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	33,45	R\$ 20,40	R\$ 682,38		R\$ 682,38					100%	33,45	R\$ 682,38		
3.9.2.14	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	2,28	R\$ 28,91	R\$ 65,91		R\$ 65,91					100%	2,28	R\$ 65,91		
3.9.2.15	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	18,31	R\$ 10,81	R\$ 197,93		R\$ 197,93					100%	18,31	R\$ 197,93		
3.9.2.16	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 72,95	R\$ 72,95		R\$ 72,95					100%	1,00	R\$ 72,95		
3.9.2.17	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "30" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 89,64	R\$ 89,64		R\$ 89,64					100%	1,00	R\$ 89,64		

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.									
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03					
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43		
MEDIÇÕES															AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
3.9.2.18	16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)	Próprio	UND	1,00	R\$ 196,60	R\$ 196,60		R\$ 196,60					100%	1,00	R\$ 196,60	
3.9.2.19	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,41	R\$ 37,23		R\$ 37,23					100%	3,00	R\$ 37,23	
3.9.2.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,21	R\$ 16,21		R\$ 16,21					100%	1,00	R\$ 16,21	
3.9.3	SANITÁRIO						R\$ 7.039,64										
3.9.3.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 232,20	R\$ 232,20		R\$ 232,20					100%	1,00	R\$ 232,20	
3.9.3.2	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 72,98	R\$ 72,98		R\$ 72,98					100%	1,00	R\$ 72,98	
3.9.3.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85		R\$ 32,85					100%	3,00	R\$ 32,85	
3.9.3.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,82	R\$ 53,46		R\$ 53,46					100%	3,00	R\$ 53,46	
3.9.3.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,70	R\$ 42,80		R\$ 42,80					100%	4,00	R\$ 42,80	
3.9.3.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,02	R\$ 51,06		R\$ 51,06					100%	3,00	R\$ 51,06	
3.9.3.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,13	R\$ 31,13		R\$ 31,13					100%	1,00	R\$ 31,13	
3.9.3.8	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 46,81	R\$ 46,81		R\$ 46,81					100%	1,00	R\$ 46,81	
3.9.3.9	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,67	R\$ 38,67		R\$ 38,67					100%	1,00	R\$ 38,67	
3.9.3.10	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64		R\$ 11,64					100%	1,00	R\$ 11,64	
3.9.3.11	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40		R\$ 92,40					100%	1,00	R\$ 92,40	
3.9.3.12	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,48	R\$ 77,48		R\$ 77,48					100%	1,00	R\$ 77,48	
3.9.3.13	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,66	R\$ 14,66		R\$ 14,66					100%	1,00	R\$ 14,66	

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.												
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02					TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03			
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33		R\$ 108.647,23		R\$ 108.773,24		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43		
MEDIÇÕES																		AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO				
3.9.3.14	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,54	R\$ 23,31	R\$ 59,20		R\$ 59,21					100%	2,54	R\$ 59,20				
3.9.3.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,05	R\$ 29,55	R\$ 149,22		R\$ 149,23					100%	5,05	R\$ 149,22				
3.9.3.16	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	13,78	R\$ 41,13	R\$ 566,77		R\$ 566,77					100%	13,78	R\$ 566,77				
3.9.3.17	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40		R\$ 92,40					100%	1,00	R\$ 92,40				
3.9.3.18	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.373,91	R\$ 5.373,91		R\$ 5.373,91					100%	1,00	R\$ 5.373,91				
3.10	COBERTURA						R\$ 4.274,70													
3.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	m²	13,28	R\$ 52,95	R\$ 703,17			R\$ 703,18				100%	13,28	R\$ 703,17				
3.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	m²	13,28	R\$ 92,74	R\$ 1.231,58			R\$ 1.231,59				100%	13,28	R\$ 1.231,58				
3.10.3	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.118,88	R\$ 2.237,76			R\$ 2.237,76				100%	2,00	R\$ 2.237,76				
3.10.4	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,20	R\$ 26,31	R\$ 84,19			R\$ 84,19				100%	3,20	R\$ 84,19				
3.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	m²	1,33	R\$ 13,54	R\$ 18,00			R\$ 18,01				100%	1,33	R\$ 18,00				
3.11	ESQUADRIAS						R\$ 1.059,28													
3.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 443,77	R\$ 443,77				100%	1,00	R\$ 443,77	100%	1,00	R\$ 443,77				
3.11.2	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 429,64	R\$ 429,64				100%	1,00	R\$ 429,64	100%	1,00	R\$ 429,64				
3.11.3	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	m²	1,08	R\$ 172,11	R\$ 185,87			R\$ 185,88				100%	1,08	R\$ 185,87				
4	MURO						R\$ 92.758,00													
4.1	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 3.514,02													
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	m³	30,57	R\$ 96,82	R\$ 2.959,78	R\$ 2.959,78						100%	30,57	R\$ 2.959,78				
4.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	m³	22,43	R\$ 24,71	R\$ 554,24	R\$ 554,24						100%	22,43	R\$ 554,24				

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.									
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03			
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33		R\$ 108.647,23		R\$ 108.773,24		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 = R\$ 59.587,43	
MEDIÇÕES																AVANÇO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	
4.2	FUNDAÇÃO						R\$ 24.777,85										
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	m²	20,49	R\$ 44,90	R\$ 920,00	R\$ 920,00						100%	20,49	R\$ 920,00	
4.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	m²	35,00	R\$ 7,07	R\$ 247,45	R\$ 247,45						100%	35,00	R\$ 247,45	
4.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	8,14	R\$ 559,81	R\$ 4.556,85	R\$ 4.556,85						100%	8,14	R\$ 4.556,85	
4.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m³	8,14	R\$ 331,13	R\$ 2.695,39	R\$ 2.695,39						100%	8,14	R\$ 2.695,39	
4.2.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	22,77	R\$ 93,61	R\$ 2.131,49	R\$ 2.131,49						100%	22,77	R\$ 2.131,49	
4.2.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	m²	45,05	R\$ 102,97	R\$ 4.638,79	R\$ 4.638,79						100%	45,05	R\$ 4.638,79	
4.2.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	138,70	R\$ 17,40	R\$ 2.413,38	R\$ 2.413,38						100%	138,70	R\$ 2.413,38	
4.2.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	89,00	R\$ 18,75	R\$ 1.668,75	R\$ 1.668,75						100%	89,00	R\$ 1.668,75	
4.2.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,80	R\$ 16,16	R\$ 1.984,44	R\$ 1.984,44						100%	122,80	R\$ 1.984,44	
4.2.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	m²	65,27	R\$ 53,95	R\$ 3.521,31	R\$ 3.521,31						100%	65,27	R\$ 3.521,31	
4.3	SUPERESTRUTURA-MURO						R\$ 25.900,38										
4.3.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	m²	77,22	R\$ 82,09	R\$ 6.338,98	R\$ 6.338,98						100%	77,22	R\$ 6.338,98	
4.3.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	m²	45,51	R\$ 101,44	R\$ 4.616,53	R\$ 4.616,53						100%	45,51	R\$ 4.616,53	
4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,80	R\$ 15,87	R\$ 2.282,10	R\$ 2.282,10						100%	143,80	R\$ 2.282,10	
4.3.4	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	305,90	R\$ 14,50	R\$ 4.435,55	R\$ 4.435,55						100%	305,90	R\$ 4.435,55	
4.3.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	120,50	R\$ 14,08	R\$ 1.696,64	R\$ 1.696,64						100%	120,50	R\$ 1.696,64	

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03						
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43					
MEDIÇÕES																	AVANÇO	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
4.3.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	m³	7,33	R\$ 559,81	R\$ 4.103,40		R\$ 4.103,41					100%	7,33	R\$ 4.103,40		
4.3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	m²	7,33	R\$ 331,13	R\$ 2.427,18		R\$ 2.427,18					100%	7,33	R\$ 2.427,18		
4.4	REVESTIMENTO- MURO						R\$ 38.565,75											
4.4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	m²	126,59	R\$ 67,73	R\$ 8.573,94		R\$ 8.573,94					100%	126,59	R\$ 8.573,94		
4.4.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	m²	253,19	R\$ 7,56	R\$ 1.914,11		R\$ 1.914,12					100%	253,19	R\$ 1.914,11		
4.4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	m²	253,19	R\$ 44,72	R\$ 11.322,65		R\$ 11.322,66					100%	253,19	R\$ 11.322,65		
4.4.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	m²	102,07	R\$ 4,27	R\$ 435,83				100%	102,07	R\$ 435,83	100%	102,07	R\$ 435,83		
4.4.5	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	253,19	R\$ 18,44	R\$ 4.668,82				100%	253,19	R\$ 4.668,82	100%	253,19	R\$ 4.668,82		
4.4.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	253,19	R\$ 14,05	R\$ 3.557,31				100%	253,19	R\$ 3.557,31	100%	253,19	R\$ 3.557,31		
4.4.7	10	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)	Próprio	m²	30,00	R\$ 189,69	R\$ 5.690,70		R\$ 5.690,70					100%	30,00	R\$ 5.690,70		
4.4.8	24	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)	Próprio	M	39,96	R\$ 60,12	R\$ 2.402,39		R\$ 2.402,40					100%	39,96	R\$ 2.402,39		
5	URBANIZAÇÃO						R\$ 82.217,37											
5.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 71.588,16											
5.1.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	m²	192,00	R\$ 93,84	R\$ 18.017,28			R\$ 18.017,28				100%	192,00	R\$ 18.017,28		
5.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	132,02	R\$ 39,94	R\$ 5.272,87			R\$ 5.272,88				100%	132,02	R\$ 5.272,87		
5.1.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	121,37	R\$ 43,06	R\$ 5.226,19			R\$ 5.226,19				100%	121,37	R\$ 5.226,19		
5.1.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	m²	400,00	R\$ 73,92	R\$ 29.568,00			R\$ 29.568,00				100%	400,00	R\$ 29.568,00		
5.1.5	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	m²	5,10	R\$ 134,67	R\$ 686,81			R\$ 686,82				100%	5,10	R\$ 686,81		

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03						
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43			
MEDIÇÕES															AVANÇO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
5.1.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021			SINAPI	M	253,39	R\$ 1,77	R\$ 448,50			R\$ 448,50				100%	253,39	R\$ 448,50
5.1.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			SINAPI	m²	38,00	R\$ 156,39	R\$ 5.942,82			R\$ 5.942,82				100%	38,00	R\$ 5.942,82
5.1.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			SINAPI	m²	1,00	R\$ 156,39	R\$ 156,39			R\$ 156,39				100%	1,00	R\$ 156,39
5.1.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021			SINAPI	m²	5,10	R\$ 67,51	R\$ 344,30			R\$ 344,30				100%	5,10	R\$ 344,30
5.1.10	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			SINAPI	m²	250,00	R\$ 23,70	R\$ 5.925,00				100%	250,00	R\$ 5.925,00	100%	250,00	R\$ 5.925,00
5.2	PAISAGISMO								R\$ 2.906,46									
5.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			SINAPI	m²	25,69	R\$ 23,70	R\$ 608,85				100%	25,69	R\$ 608,85	100%	25,69	R\$ 608,85
5.2.2	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024			SINAPI	m²	25,69	R\$ 3,73	R\$ 95,82				100%	25,69	R\$ 95,82	100%	25,69	R\$ 95,82
5.2.3	25	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)			Próprio	UND	3,00	R\$ 733,93	R\$ 2.201,79				100%	3,00	R\$ 2.201,79	100%	3,00	R\$ 2.201,79
5.3	BANCOS								R\$ 7.722,75									
5.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			SINAPI	m³	1,92	R\$ 96,82	R\$ 185,89		R\$ 185,89					100%	1,92	R\$ 185,89
5.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			SINAPI	m²	6,40	R\$ 7,07	R\$ 45,24		R\$ 45,25					100%	6,40	R\$ 45,24
5.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			SINAPI	m²	6,40	R\$ 44,90	R\$ 287,36		R\$ 287,36					100%	6,40	R\$ 287,36
5.3.4	8	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]			Próprio	m²	1,92	R\$ 120,42	R\$ 231,20		R\$ 231,21					100%	1,92	R\$ 231,20
5.3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			SINAPI	m²	14,40	R\$ 5,51	R\$ 79,34				100%	14,40	R\$ 79,34	100%	14,40	R\$ 79,34
5.3.6	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			SINAPI	m²	14,40	R\$ 48,77	R\$ 702,28				100%	14,40	R\$ 702,28	100%	14,40	R\$ 702,28
5.3.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			SINAPI	m²	14,40	R\$ 14,88	R\$ 214,27				100%	14,40	R\$ 214,27	100%	14,40	R\$ 214,27

		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03						
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)				R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43			
MEDIÇÕES															AVANÇO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
5.3.8	8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	Próprio	m²	14,40	R\$ 120,42	R\$ 1.734,04				100%	14,40	R\$ 1.734,04	100%	14,40	R\$ 1.734,04		
5.3.9	7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)	Próprio	m²	6,50	R\$ 652,79	R\$ 4.243,13				100%	6,50	R\$ 4.243,13	100%	6,50	R\$ 4.243,13		
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						R\$ 46.833,66											
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	m³	13,41	R\$ 96,82	R\$ 1.298,35		R\$ 1.298,36					100%	13,41	R\$ 1.298,36		
6.2	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 270,15	R\$ 4.052,25		R\$ 4.052,25					100%	15,00	R\$ 4.052,25		
6.3	20	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)	Próprio	UND	1,00	R\$ 8,85	R\$ 8,85		R\$ 8,85					100%	1,00	R\$ 8,85		
6.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,58	R\$ 55,74		R\$ 55,74					100%	3,00	R\$ 55,74		
6.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,01	R\$ 33,03		R\$ 33,03					100%	3,00	R\$ 33,03		
6.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,97	R\$ 71,82		R\$ 71,82					100%	6,00	R\$ 71,82		
6.7	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,07	R\$ 120,56		R\$ 120,56					100%	8,00	R\$ 120,56		
6.8	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 30" KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 89,64	R\$ 179,28		R\$ 179,28					100%	2,00	R\$ 179,28		
6.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,52	R\$ 29,04		R\$ 29,04					100%	2,00	R\$ 29,04		
6.10	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,21	R\$ 16,21		R\$ 16,21					100%	1,00	R\$ 16,21		
6.11	39396	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA 1000w, USO EXTERNO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 80,15	R\$ 160,30		R\$ 160,30					100%	2,00	R\$ 160,30		
6.12	21	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T	Próprio	UND	1,00	R\$ 7.994,67	R\$ 7.994,67		R\$ 7.994,67					100%	1,00	R\$ 7.994,67		
6.13	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 119,29	R\$ 119,29		R\$ 119,29					100%	1,00	R\$ 119,29		
6.14	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 182,85	R\$ 2.925,60		R\$ 2.925,60					100%	16,00	R\$ 2.925,60		

 CONTATO: 83 9 9984-4752		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I = 22,58% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: Da 09/06/2026 a 24/07/2026		TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03						
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 28.916.888/0001-46 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000						FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)		R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 04 =		R\$ 59.587,43					
MEDIÇÕES																AVANÇO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO		
6.15	17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)	Próprio	UND	16,00	R\$ 71,30	R\$ 1.140,80		R\$ 1.140,80					100%	16,00	R\$ 1.140,80		
6.16	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 99,89	R\$ 1.598,24		R\$ 1.598,24					100%	16,00	R\$ 1.598,24		
6.17	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	569,70	R\$ 9,16	R\$ 5.218,45		R\$ 5.218,45					100%	569,70	R\$ 5.218,45		
6.18	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	24,30	R\$ 13,01	R\$ 316,14		R\$ 316,14					100%	24,30	R\$ 316,14		
6.19	29	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888)	Próprio	UND	16,00	R\$ 1.343,44	R\$ 21.495,04				100%	16,00	R\$ 21.495,04	100%	16,00	R\$ 21.495,04		
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 69.696,92	TOTAL DA MEDIÇÃO 01	TOTAL DA MEDIÇÃO 02	TOTAL DA MEDIÇÃO 03	AVANÇO NO PERÍODO	TOTAL DA MEDIÇÃO 04		AVANÇO TOTAL ACUMULADO	VALOR TOTAL ACUMULADO			
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 308.904,31											
VALOR TOTAL:							R\$ 378.601,23	R\$ 101.593,33	R\$ 108.647,23	R\$ 108.773,24	15,74%	R\$ 59.587,43		100,00%	R\$ 378.601,23			
											Eng. Responsável Técnico da Execução			Eng. Responsável Técnico da Fiscalização				
