



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.938/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026


VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23


DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
1.1.1										
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
1.2.1		Perímetro externo								
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024								
		Terreno								
2	QUIOSQUE									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
		Perímetro (Quiosque e WC)								
2.2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
2.2.1.1		Sapatas e vigas baldrames (S4=S5=S7=S8=S10=S11)								
2.2.1.2		Sapatas e vigas baldrames (S2=S3=S12=S13)								
2.2.1.3		Sapatas e vigas baldrames (S1=S14)								
2.2.1.4		Sapatas e vigas baldrames (S6=S9)								
2.2.1.5		Sapatas e vigas baldrames (VB1)								
2.2.1.6		Sapatas e vigas baldrames (VB2)								
2.2.1.7		Sapatas e vigas baldrames (VB3)								
2.2.1.8		Sapatas e vigas baldrames (VB4)								
2.2.1.9		Sapatas e vigas baldrames (VB5)								
2.2.1.10		Sapatas e vigas baldrames (VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13)								
2.2.1	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
2.2.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
2.3	FUNDAÇÃO									
2.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
2.3.1.1		S4=S5=S7=S8=S10=S11								
2.3.1.2		S2=S3=S12=S13								
2.3.1.3		S1=S14								
2.3.1.4		S6=S9								
2.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
2.3.2.1		S4=S5=S7=S8=S10=S11								
2.3.2.2		S2=S3=S12=S13								
2.3.2.3		S1=S14								
2.3.2.4		S6=S9								
2.3.2.5		VB1								
2.3.2.6		VB2								
2.3.2.7		VB3								
2.3.2.8		VB4								
2.3.2.9		VB5								
2.3.2.10		VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13								
2.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
2.3.3.1		Sapatas								
2.3.3.2		Vigas Baldrames								
2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
2.3.4.1		Lançamento								

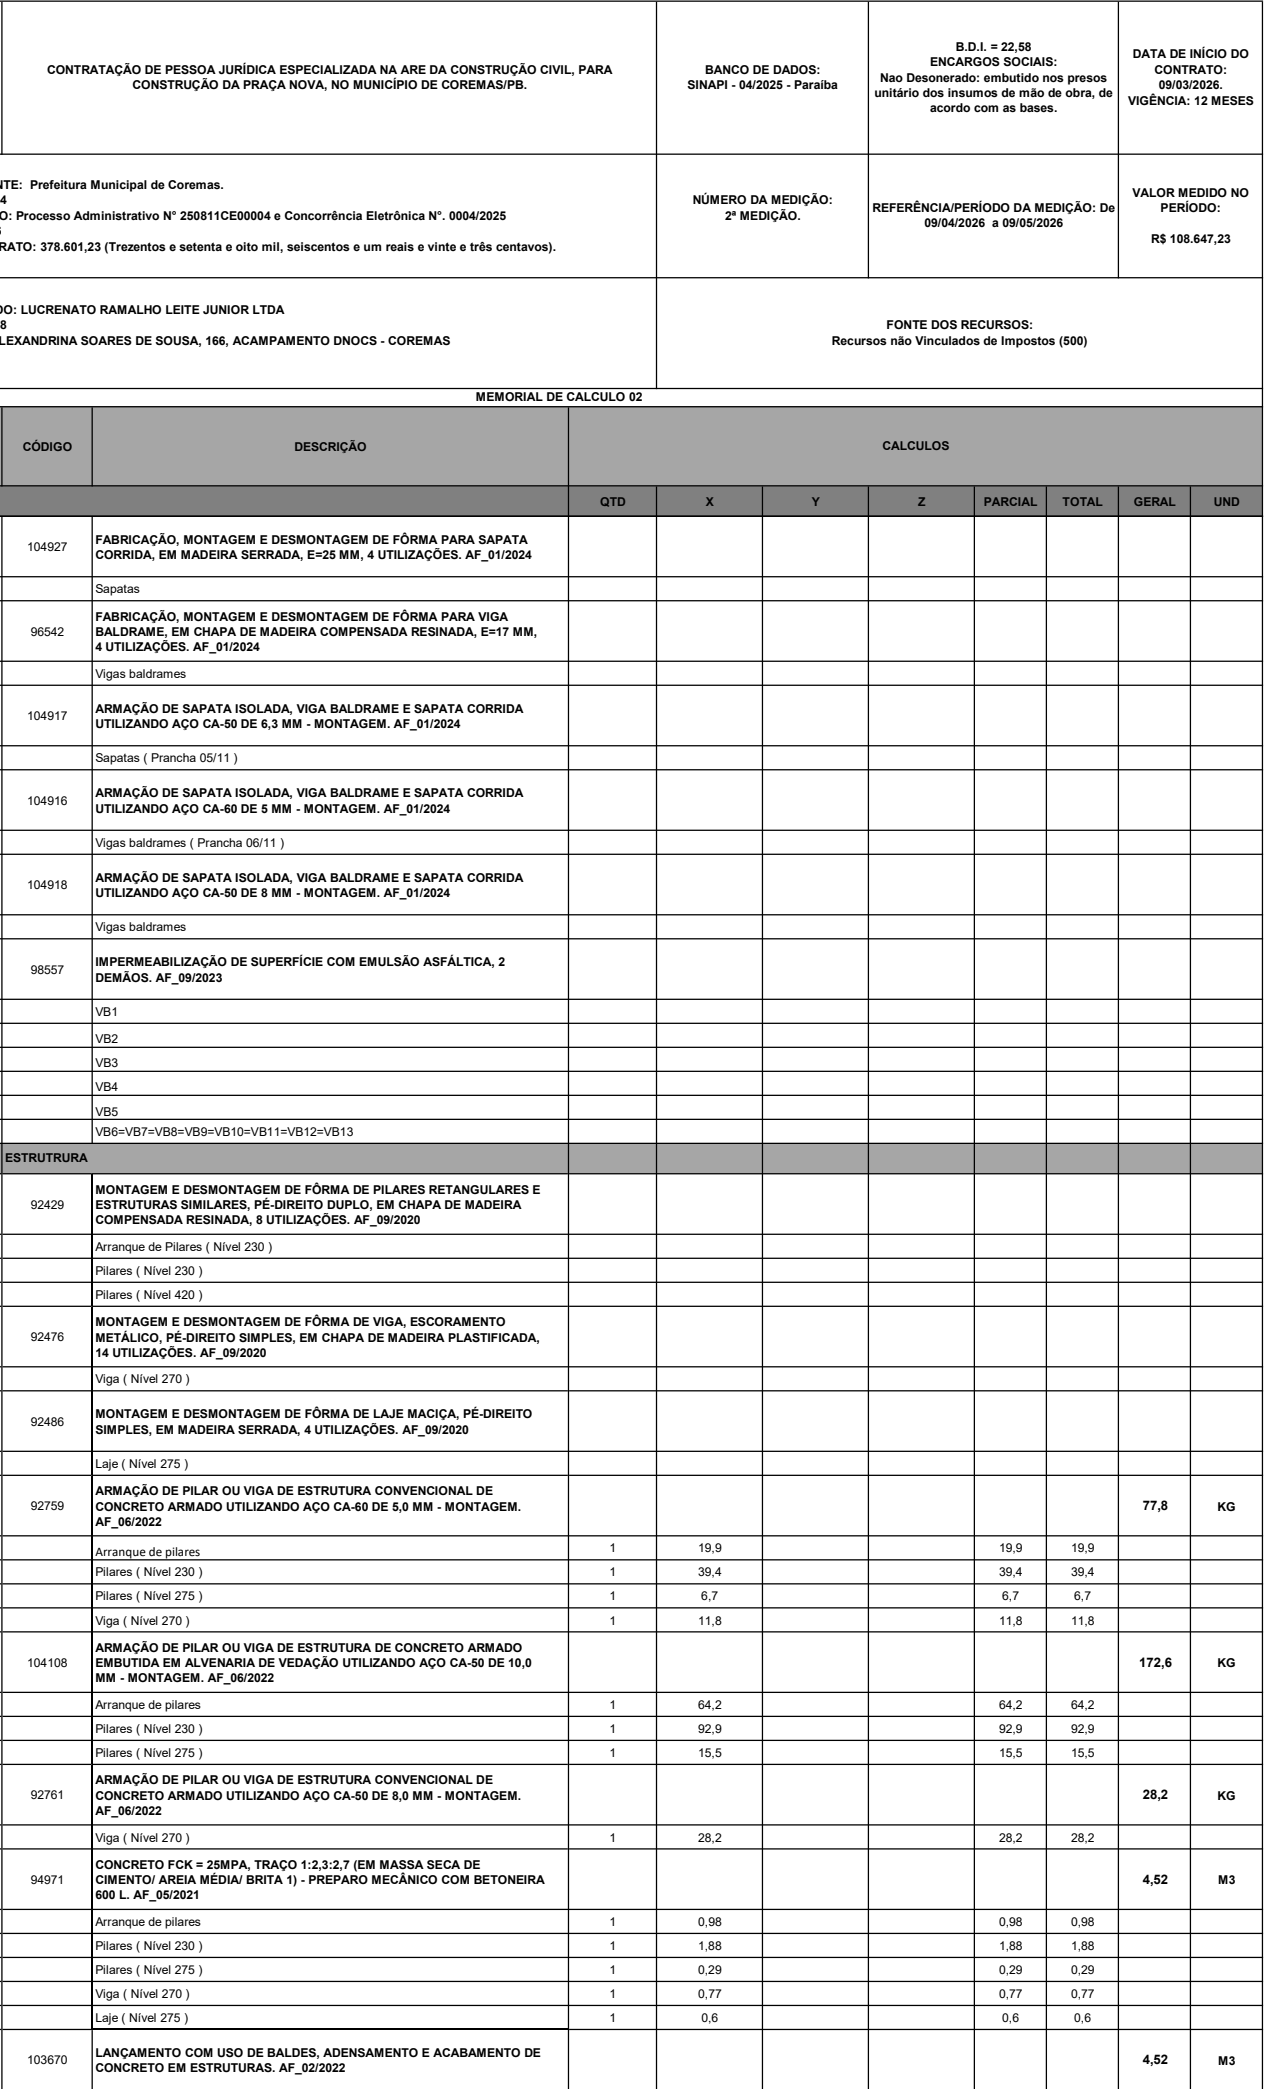

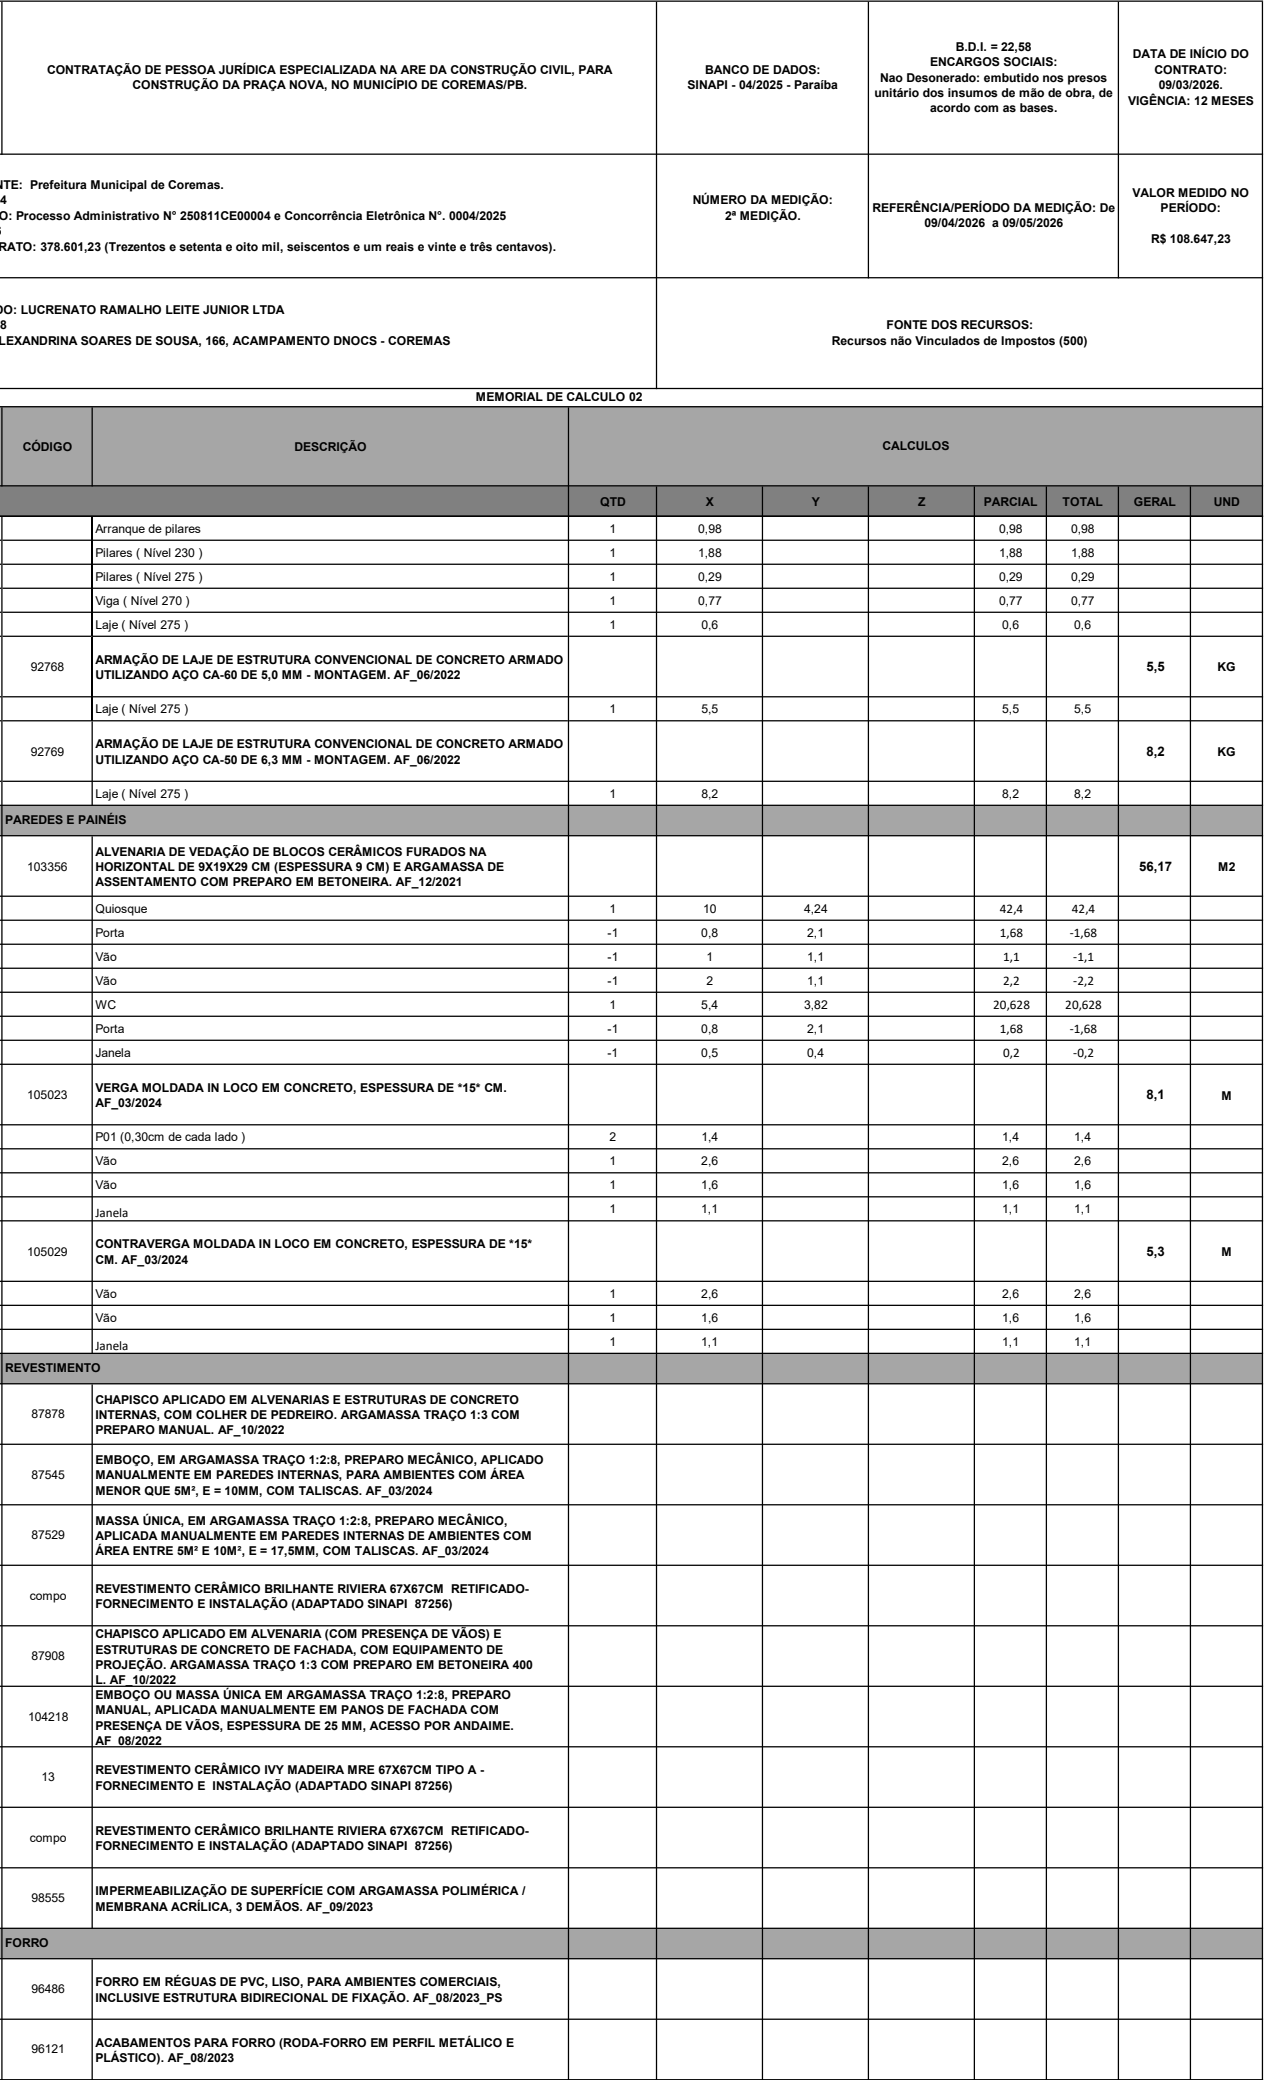



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.9.1.15	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	UN
2.9.1.15.1		Conexões de tubo	1	1			1	1		
2.9.1.16	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							8	UN
2.9.1.16.1		Conexões de tubo	1	8			8	8		
2.9.1.17	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	UN
2.9.1.17.1		Conexões de tubo	1	1			1	1		
2.9.1.18	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							7	UN
2.9.1.18.1		Conexões de tubo	1	7			7	7		
2.9.1.19	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							7	UN
2.9.1.19.1		Conexões de tubo	1	7			7	7		
2.9.1.20	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							1	UN
2.9.1.20.1		Conexões de tubo	1	1			1	1		
2.9.1.21	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							1	UN
2.9.1.21.1		Conexões de tubo	1	1			1	1		
2.9.1.22	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							3	UN
2.9.1.22.1		Conexões de tubo	1	3			3	3		
2.9.1.23	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							1	UN
2.9.1.23.1		Conexões de tubo	1	1			1	1		
2.9.1.24	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							20,26	M
2.9.1.24.1		Tubos	1	20,26			20,26	20,26		
2.9.1.25	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							3,61	M
2.9.1.25.1		Tubos	1	3,61			3,61	3,61		
2.9.2	ELÉTRICA									
2.9.2.1	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							2	UN
2.9.2.1.1			1	2			2	2		
2.9.2.2	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							4	UN
2.9.2.2.1			1	4			4	4		
2.9.2.3	00039470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "30" KA (TIPO AC)							2	UN
2.9.2.3.1			1	2			2	2		
2.9.2.4	16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)							1	UN
2.9.2.4.1			1	1			1	1		
2.9.2.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
2.9.2.5.1			1	1			1	1		
2.9.2.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
2.9.2.6.1			1	1			1	1		
2.9.2.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
2.9.2.7.1			1	1			1	1		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.9.2.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
2.9.2.8.1			1	1			1	1		
2.9.2.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
2.9.2.9.1			1	1			1	1		
2.9.2.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
2.9.2.10.1			1	1			1	1		
2.9.2.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							1	UN
2.9.2.11.1			1	1			1	1		
2.9.2.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023							1	UN
2.9.2.12.1			1	1			1	1		
2.9.2.13	17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)							1	UND
2.9.2.13.1			1	1			1	1		
2.9.2.14	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							3	UN
2.9.2.14.1			1	3			3	3		
2.9.2.15	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
2.9.2.15.1			1	1			1	1		
2.9.2.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							127,8	M
2.9.2.16.1		Fase	1	42,6			42,6	42,6		
2.9.2.16.2		Neutro	1	42,6			42,6	42,6		
2.9.2.16.3		Terra	1	42,6			42,6	42,6		
2.9.2.17	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							111,6	M
2.9.2.17.1		Fase	1	12,6			12,6	12,6		
2.9.2.17.2		Neutro	1	37,7			37,7	37,7		
2.9.2.17.3		Terra	1	61,3			61,3	61,3		
2.9.2.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							27,2	M
2.9.2.18.1		Fase	1	13,6			13,6	13,6		
2.9.2.18.2		Neutro	1	13,6			13,6	13,6		
2.9.2.19	23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)							38,76	M
2.9.2.19.1			1	38,76			38,76	38,76		
2.9.2.20	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							28,53	M
2.9.2.20.1			1	28,53			28,53	28,53		
2.9.2.21	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							21,31	M
2.9.2.21.1			1	21,31			21,31	21,31		
2.9.3	SANITÁRIAS									
2.9.3.1	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020							1	UN
2.9.3.1.1			1	1			1	1		
2.9.3.2	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022							1	UN
2.9.3.2.1			1	1			1	1		
2.9.3.3	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022							1	UN



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.938/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
2.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
2.10.3	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
2.10.4	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
2.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021								
2.10.6	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
2.11	ESQUADRIAS									
2.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
2.11.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020								
2.11.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3	GUARITA									
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
3.1.1.1		Perímetro (Guarita e WC)								
3.2	MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
3.2.1.1		S1=S2=S3=S4 (Sapatas)								
3.2.1.2		VB1 E VB2 (Vigas Baldrames Nível +0)								
3.2.1.3		VB3, VB4, VB5 (Vigas Baldrames Nível +0)								
3.2.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
3.2.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
3.3	FUNDAÇÃO									
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
3.3.1.1		S1=S2=S3=S4								
3.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
3.3.2.1		S1=S2=S3=S4 (Sapatas)								
3.3.2.2		VB1 E VB2 (Vigas Baldrames Nível +0)								
3.3.2.3		VB3, VB4, VB5 (Vigas Baldrames Nível +0)								
3.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
3.3.3.1		Sapatas (Nível +0)								
3.3.3.2		Vigas Baldrames (Nível +0)								
3.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
3.3.4.1		Lançamento								
3.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
3.3.5.1		Sapatas (Nível +0)								
3.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
3.3.6.1		Vigas Baldrames (Nível +0)								



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.938/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.5.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021							36,76	M2
3.5.1.1		Guarita	1	6,5	3		19,5	19,5		
3.5.1.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
3.5.1.3		Janela de cobogó	-2	1,1	1,1		1,21	-2,42		
3.5.1.4		WC	1	7,6	3,03		23,028	23,03		
3.5.1.5		Porta	-1	0,7	2,1		1,47	1,47		
3.5.1.6		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
3.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024							7,2	M
3.5.2.1			1	1,4			1,4	1,4		
3.5.2.2			1	1,3			1,3	1,3		
3.5.2.3			2	1,7			1,7	3,4		
3.5.2.4			1	1,1			1,1	1,1		
3.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024							4,5	M
3.5.3.1			2	1,7			1,7	3,4		
3.5.3.2			1	1,1			1,1	1,1		
3.6	REVESTIMENTO									
3.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022								
3.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								
3.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								
3.6.4	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022								
3.6.5	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022								
3.6.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023								
3.6.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
3.7	PINTURA INTERNA									
3.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								
3.7.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023								
3.7.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
3.7.4	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS								
3.8	PISO									
3.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024							8,25	M2
3.8.1.1		Guarita	1	5			5	5		
3.8.1.2		WC	1	3,25			3,25	3,25		
3.8.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021							8,25	M2
3.8.2.1		Guarita	1	5			5	5		
3.8.2.2		WC	1	3,25			3,25	3,25		
3.8.3	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)								
3.9	INSTALAÇÕES									
3.9.1	HIDRÁULICA									



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De
09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.9.1.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021							1	UN
3.9.1.1.1			1	1			1	1		
3.9.1.2	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"							1	UN
3.9.1.2.1			1	1			1	1		
3.9.1.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							1	UN
3.9.1.3.1			1	1			1	1		
3.9.1.4	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"							1	UN
3.9.1.4.1			1	1			1	1		
3.9.1.5	10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)							1	UN
3.9.1.5.1			1	1			1	1		
3.9.1.6	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"							1	UN
3.9.1.6.1			1	1			1	1		
3.9.1.7	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							1	UN
3.9.1.7.1			1	1			1	1		
3.9.1.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							1	UN
3.9.1.8.1			1	1			1	1		
3.9.1.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							1	UN
3.9.1.9.1			1	1			1	1		
3.9.1.10	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							1	UN
3.9.1.10.1			1	1			1	1		
3.9.1.11	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							1	UN
3.9.1.11.1			1	1			1	1		
3.9.1.12	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							1	UN
3.9.1.12.1			1	1			1	1		
3.9.1.13	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							1	UN
3.9.1.13.1			1	1			1	1		
3.9.1.14	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							7	UN
3.9.1.14.1			1	7			7	7		
3.9.1.15	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							2	UN
3.9.1.15.1			1	2			2	2		
3.9.1.16	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							2	UN
3.9.1.16.1			1	2			2	2		
3.9.1.17	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							6	UN
3.9.1.17.1			1	6			6	6		
3.9.1.18	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							3	UN
3.9.1.18.1			1	3			3	3		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.9.1.19	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	UN
3.9.1.19.1			1	1			1	1		
3.9.1.20	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	UN
3.9.1.20.1			1	1			1	1		
3.9.1.21	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							6	UN
3.9.1.21.1			1	6			6	6		
3.9.1.22	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							1	UN
3.9.1.22.1			1	1			1	1		
3.9.1.23	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							26,14	M
3.9.1.23.1			1	26,14			26,14	26,14		
3.9.1.24	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							2,62	M
3.9.1.24.1			1	2,62			2,62	2,62		
3.9.2	ELÉTRICO									
3.9.2.1	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							2	UN
3.9.2.1.1			1	2			2	2		
3.9.2.2	95741	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							1	UN
3.9.2.2.1			1	1			1	1		
3.9.2.3	104447	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							4	UN
3.9.2.3.1			1	4			4	4		
3.9.2.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
3.9.2.4.1			1	1			1	1		
3.9.2.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
3.9.2.5.1			1	1			1	1		
3.9.2.6	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO							1	UN
3.9.2.6.1			1	1			1	1		
3.9.2.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
3.9.2.7.1			1	1			1	1		
3.9.2.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
3.9.2.8.1			1	1			1	1		
3.9.2.9	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							1	UN
3.9.2.9.1			1	1			1	1		
3.9.2.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							16,6	M
3.9.2.10.1			1	8,3			8,3	8,3		
3.9.2.10.2			1	4,9			4,9	4,9		
3.9.2.10.3			1	3,4			3,4	3,4		
3.9.2.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							52,2	M
3.9.2.11.1			1	17,4			17,4	17,4		
3.9.2.11.2			1	17,4			17,4	17,4		
3.9.2.11.3			1	17,4			17,4	17,4		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.		BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba	B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES
---	--	---	---	--

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.938/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).	NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.	REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026	VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23
--	-----------------------------------	---	--

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-49 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000	FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)
--	--

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.9.2.12	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							112,2	M
3.9.2.12.1			1	37,4			37,4	37,4		
3.9.2.12.2			1	37,4			37,4	37,4		
3.9.2.12.3			1	37,4			37,4	37,4		
3.9.2.13	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							33,45	M
3.9.2.13.1			1	33,45			33,45	33,45		
3.9.2.14	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							2,28	M
3.9.2.14.1			1	2,28			2,28	2,28		
3.9.2.15	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							18,31	M
3.9.2.15.1			1	18,31			18,31	18,31		
3.9.2.16	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)							1	UN
3.9.2.16.1			1				1	1		
3.9.2.17	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)							1	UN
3.9.2.17.1			1				1	1		
3.9.2.18	16	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)							1	UND
3.9.2.18.1			1				1	1		
3.9.2.19	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							3	UN
3.9.2.19.1			3				3	3		
3.9.2.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
3.9.2.20.1			1				1	1		
3.9.3	SANITÁRIO									
3.9.3.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020							1	UN
3.9.3.1.1			1	1			1	1		
3.9.3.2	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022							1	UN
3.9.3.2.1			1	1			1	1		
3.9.3.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							3	UN
3.9.3.3.1			1	3			3	3		
3.9.3.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							3	UN
3.9.3.4.1			1	3			3	3		
3.9.3.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							4	UN
3.9.3.5.1			1	4			4	4		
3.9.3.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							3	UN
3.9.3.6.1			1	3			3	3		
3.9.3.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							1	UN
3.9.3.7.1			1	1			1	1		
3.9.3.8	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							1	UN
3.9.3.8.1			1				1	1		
3.9.3.9	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							1	UN



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.938/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.9.3.9.1			1				1	1		
3.9.3.10	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							1	UN
3.9.3.10.1			1				1	1		
3.9.3.11	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022							1	UN
3.9.3.11.1			1	1			1	1		
3.9.3.12	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							1	UN
3.9.3.12.1			1	1			1	1		
3.9.3.13	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA							1	UN
3.9.3.13.1			1	1			1	1		
3.9.3.14	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							2,54	M
3.9.3.14.1			1	2,54			2,54	2,54		
3.9.3.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							5,05	M
3.9.3.15.1			1	5,05			5,05	5,05		
3.9.3.16	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							13,78	M
3.9.3.16.1			1	13,78			13,78	13,78		
3.9.3.17	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022							1	UN
3.9.3.17.1			1	1			1	1		
3.9.3.18	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020							1	UN
3.9.3.18.1			1	1			1	1		
3.10	COBERTURA									
3.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
3.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
3.10.3	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
3.10.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
3.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021								
3.11	ESQUADRIAS									
3.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3.11.2	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3.11.3	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020								
4	MURO									
4.1	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
4.1.1.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.1.1.2		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.1.1.3		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.1.1.4		S12 (Sapata)								
4.1.1.5		VB1 (Vigas Baldrames)								

 CONTATO: 83 9 9984-4752	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.			BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES		
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).				NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23		
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000				FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)						
MEMORIAL DE CALCULO 02										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
4.1.1.6		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.7		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.8		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.9		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.10		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.11		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.12		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.13		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.14		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.15		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.16		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
4.1.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
4.2	FUNDAÇÃO									
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
4.2.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.1.1.13		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.1.1.14		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.1.1.15		S12 (Sapata)								
4.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
4.2.2.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.2.2.2		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.2.2.3		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.2.2.4		S12 (Sapata)								
4.2.2.5		VB1 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.6		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.7		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.8		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.9		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.10		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.11		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.12		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.13		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.14		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.15		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.16		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
4.2.3.1		Sapatas								
4.2.3.2		Vigas Baldrames								
4.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
4.2.4.1										
4.2.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
4.2.5.1		Sapatas								
4.2.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
4.2.6.1		Vigas baldrames								
4.2.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
4.2.7.1		Sapatas								
4.2.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
4.2.8.1		Vigas baldrames								
4.2.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTES DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
4.2.9.1		Sapatas								
4.2.9.2		Vigas baldrames								
4.2.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023								
4.2.10.1		VB1 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.2		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.3		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.4		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.5		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.6		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.7		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.8		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.9		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.10		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.11		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.12		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.3	SUPERESTRUTURA-MURO									
4.3.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.3.1.1		Arranque de pilares (Nível 0)								
4.3.1.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.1.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.3.2.1		Vigas (Nível 130)								
4.3.2.2		Vigas (Nível 230)								
4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.3.1		Arranque de pilares								
4.3.3.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.3.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.3.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.4	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.4.1		Arranque de pilares								
4.3.4.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.4.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.4.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.5.1		Vigas (Nível 130)								
4.3.5.2		Vigas (Nível 230)								
4.3.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021							7,33	M3
4.3.6.1		Arranque de pilares	1	1,3			1,3	1,3		
4.3.6.2		Pilares (Nível 130)	1	1,69			1,69	1,69		
4.3.6.3		Pilares (Nível 230)	1	1,3			1,3	1,3		
4.3.6.4		Vigas (Nível 130)	1	1,22			1,22	1,22		
4.3.6.5		Vigas (Nível 230)	1	1,82			1,82	1,82		
4.3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022							7,33	M3
4.3.6.1		Arranque de pilares	1	1,3			1,3	1,3		
4.3.6.2		Pilares (Nível 130)	1	1,69			1,69	1,69		
4.3.6.3		Pilares (Nível 230)	1	1,3			1,3	1,3		
4.3.6.4		Vigas (Nível 130)	1	1,22			1,22	1,22		
4.3.6.5		Vigas (Nível 230)	1	1,82			1,82	1,82		
4.4	REVESTIMENTO- MURO									
4.4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M linear entre Pilares					126,59	M2
4.4.1.1		Muro (Parte total em alvenaria)	1	39,96	2,3		91,908	91,908		

 CONTATO: 83 9 9984-4752	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES		
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).					NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23		
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000					FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)						
MEMORIAL DE CALCULO 02											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS								
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND	
4.4.1.2		Muro (Parte em madeira)	1	26,68	1,3		34,684	34,684			
4.4.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Lados	M linear entre Pilares					253,19	M2	
4.4.2.1		Muro (Parte total em alvenaria)	2	39,96	2,3		91,908	183,82			
4.4.2.2		Muro (Parte em madeira)	2	26,68	1,3		34,684	69,37			
4.4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		M linear entre Pilares					253,19	M2	
4.4.3.1		Muro (Parte total em alvenaria)	2	39,96	2,3		91,908	183,82			
4.4.3.2		Muro (Parte em madeira)	2	26,68	1,3		34,684	69,37			
4.4.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023									
4.4.5	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023									
4.4.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023									
4.4.7	10	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)							30	M2	
4.4.7.1		Muro (Fechamento em madeira)	10	3	1		3	30			
4.4.8	24	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)							39,96	M	
4.4.8.1		Muro (Pingadeira)	1	39,96	1		39,96	39,96			
5	URBANIZAÇÃO										
5.1	PAVIMENTAÇÃO										
5.1.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022									
5.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024									
5.1.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024									
5.1.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022									
5.1.5	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024									
5.1.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021									
5.1.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024									
5.1.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024									
5.1.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021									
5.1.10	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024									
5.2	PAISAGISMO										
5.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024									
5.2.2	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024									
5.2.3	25	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)									
5.3	BANCOS										
5.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		Per.	Largura do bloco	Escav ação			1,92	M3	



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.938/0001-94
PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025
CONTRATO N°. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
2ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.647,23

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-49
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
5.3.1.1		Banco (Base em alvenaria)	8	4	0,2	0,3	0,24	1,92		
5.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		Per.					6,4	M2
5.3.2.1		Banco (Base em alvenaria)	8	4	0,2		0,8	6,4		
5.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		Per.					6,4	M2
5.3.3.1		Banco (Base em alvenaria)	8	4	0,2		0,8	6,4		
5.3.4	8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	Embasamento	Per.					1,92	M2
5.3.4.1		Banco (Base em alvenaria)	8	4	0,2	0,3	0,24	1,92		
5.3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022								
5.3.6	87528	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,6MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								
5.3.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								
5.3.8	8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]								
5.3.9	7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)								
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024							13,41	M3
6.1.1		Eletrodutos	1	138,36	0,3	0,3	12,4524	12,45		
6.1.2		Caixa de passagem	15	0,4	0,4	0,4	0,064	0,96		
6.2	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020							15	UN
6.2.1			1	15			15	15		
6.3	20	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)							1	UND
6.3.1			1	1			1	1		
6.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							3	UN
6.4.1			1	3			3	3		
6.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							3	UN
6.5.1			1	3			3	3		
6.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							6	UN
6.6.1			1	6			6	6		
6.7	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021							8	UN
6.7.1			1	8			8	8		
6.8	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)							2	UN
6.8.1			1	2			2	2		
6.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								UN
6.9.1			1	2			2	2		
6.10	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							1	UN
6.10.1			1	1			1	1		
6.11	39396	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO							2	UN
6.11.1			1	2			2	2		

 CONTATO: 83 9 9984-4752	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.		BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES			
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.938/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025 CONTRATO Nº. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).			NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/04/2026 a 09/05/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.647,23			
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000			FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)							
MEMORIAL DE CALCULO 02										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
6.12	21	PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T								UND
6.12.1			1	1			1	1		
6.13	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								UN
6.13.1			1	1			1	1		
6.14	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							16	UN
6.14.1			1	16			16	16		
6.15	17	CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)							16	UND
6.15.1			1	16			16	16		
6.16	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023							16	UN
6.16.1			1	16			16	16		
6.17	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							569,7	M
6.17.1		Fase	1	238,1			238,1	238,1		
6.17.2		Neutro	1	238,1			238,1	238,1		
6.17.3		Terra	1	93,5			93,5	93,5		
6.18	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							24,3	M
6.18.1		Fase	1	8,1			8,1	8,1		
6.18.2		Neutro	1	8,1			8,1	8,1		
6.18.3		Terra	1	8,1			8,1	8,1		
6.19	29	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888)								
Eng. Responsável Técnico da Execução			Eng. Responsável Técnico da Fiscalização							
